

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Coordinación Nacional de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas

PROYECTO: CII K003 Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad.

Líder del Proyecto:	Villacís Yépez, María Cristina (mvillacis@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benalcázar Alarcón, Patricio Vicente	Programas Relacionados:	PROMOCIÓN, GARANTÍA Y DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO, PROMOCIÓN, GARANTÍA Y GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONDICIONES DE TRABAJO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Titular:	Ojeda, Cisne	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	196430000.0000.373882	TIR:	18.71 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	29,714.89
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	200,000.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Cooperación internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	15/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Vera Ayora, Mauricio	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de la República, a la Defensoría del Pueblo (en adelante "la DPE") le corresponde la tutela y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el Ecuador. Asimismo, la DPE es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, razón por la cual su trabajo es guiado por el Estatuto de creación y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), contenido en los Principios Relativos al Estatuto Y Funcionamiento De Las Instituciones Nacionales De Protección Y Promoción De Los Derechos Humanos (o Principios de París). En virtud de estos dos mandatos, a la Defensoría del Pueblo le corresponde desarrollar acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos. El trabajo de promoción se dirige hacia la prevención de acciones que pueden violentar derechos humanos a través, por ejemplo, de investigaciones que visibilicen el estado de situación de problemáticas en materia de derechos humanos. Así como el establecimiento de procesos de formación, educación y sensibilización en materia de derechos humanos. En tanto, la protección demanda el despliegue de acciones defensoriales y constitucionales frente a la amenaza o vulneración de derechos. Con el fin de cumplir con los mandatos de la Constitución del 2008, la DPE inició un proceso de reestructuración institucional a partir del cual creó dos direcciones nacionales encargadas de la promoción y la protección de los derechos humanos y la naturaleza. Esta nueva estructura fue pensada con el objetivo de tutelar y defender de manera integral los derechos humanos de las personas que habitan el Estado ecuatoriano, dentro de los cuales se encuentran las personas de otra nacionalidad. Es preciso señalar, que durante los diez primeros años de vida institucional la Defensoría del Pueblo centró sus actividades en la atención de casos que eran presentados como quejas ante la institución, razón por la cual desarrolló una fuerte capacidad en acciones de mediación y defensa de los consumidores y usuarios, por lo que se descuidó la atención de temas fundamentales de derechos humanos como la situación de personas refugiadas, de inmigrantes y emigrantes; de víctimas de trata y tráfico de personas, y de víctimas de desplazamiento forzado.

Beneficios Cualitativos

- * Las personas en Frontera Norte conocerán sus derechos, tendrán herramientas para defender sus derechos.
- * Las personas en contexto de movilidad humana serán capacitadas y fortalecidas a través de organizaciones locales, redes locales para la defensa de sus derechos.
- * Protección de las Personas en Contexto de Movilidad Humana.
- * Promoción y Protección de derechos de las personas en frontera norte.

Beneficios Cualitativos

*Continuidad a la Oficina de la Defensoría del Pueblo en San Lorenzo.


Restricciones

COSTO, el proyecto cuenta con un presupuesto de 115000 USD (ciento quince mil dólares)
 TIEMPO; el proyecto tiene un plazo de ejecución del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2013
 ALCANCE del Proyecto; el proyecto va a ser ejecutado en la zona 1 Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.
 La Población de referencia a ser atendida es de 35.619 personas en contexto de movilidad humana en la zona 1, sin embargo por las limitaciones en talento humano y espacios físicos de las oficinas, el número de personas que la Defensoría del Pueblo espera atender 3,562 personas en este contexto correspondiente al 10% del total de personas en contexto de movilidad humana en la zona 1 (S, E, C, I).

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 02/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

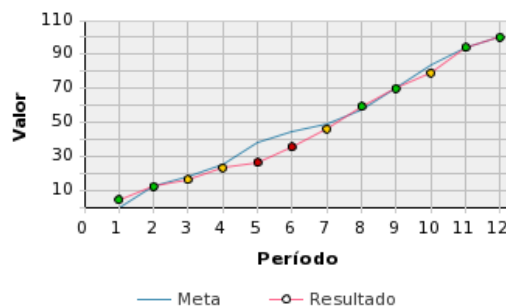

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	4 %	12 %	18 %	25 %	38 %	44 %	49 %	57 %	70 %	84 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	4 %	12 %	16 %	23 %	26 %	36 %	46 %	60 %	70 %	79 %	94 %	100 %
Estado												
	●	●	▼	▼	⊗	⊗	▼	●	●	▼	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades acordes a lo planificado:</p> <p>En una reunión en el mes de octubre con el Proyecto de Control Migratorio del Ministerio del Interior se estableció una agenda de capacitación para los nuevos funcionarios civiles del Servicio de Migración, esta propuesta fue trabajada en coordinación con ACNUR y la Dirección de Refugio.</p> <p>Los temas abordados fueron: La Movilidad Humana en la Constitución, El Procedimiento del asilo en el Ecuador, El Derecho Internacional de Refugio y las competencias de cada institución en movilidad humana.</p> <p>Para este año solo se planeo capacitar solo a los funcionarios del aeropuerto Mariscal Sucre, se realizaron tres talleres el 04, 05 y 11 de diciembre con grupos de 40 personas por taller.</p> <p>Además se participó de los eventos programados desde la DPE y otras instituciones con ocasión de la Campaña Tiempo de Derechos.</p> <p>Asistimos a una reunión de los socios legales ACNUR para realizar una evaluación anual y propuestas para el 2014.</p>	Villacís Yépez, María Cristina	05/01/2014 - 04:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Ha sido un mes de elaboración de informes, justificación de las actividades planificadas y de ir finiquitando tareas pendientes. En este mes se terminó de realizar el diagnóstico situacional de movilidad humana, el producto final del proyecto de ley de movilidad humana, los informes de promoción y protección.</p>		
<p>En la ejecución del proyecto para el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades encaminadas a la socialización del ante proyecto de ley de movilidad humana propuesto desde la Defensoría del Pueblo por eso el 05 de noviembre se realizó el primer taller con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se realizó en las instalaciones de la DPE Matriz y que fue un ejercicio de preparación para la socialización de este anteproyecto de ley a nivel nacional y masivo.</p> <p>Con la finalidad de socializar en ante proyecto de ley de movilidad humana a nivel de país se habían programado tres talleres de ámbito nacional en las ciudades de Cuenca donde participaron las provincias cercanas al Azuay, esto con fecha 14 de noviembre en el auditorium de la Gobernación del Azuay, a este talleres fueron convocados y participaron instituciones del estado, sociedad civil y organizaciones de base que trabajan con temas de movilidad humana, en igual forma se desarrollo el segundo taller nacional en Guayaquil el 21 de de noviembre en las aulas de la Universidad Espíritu Santo, donde hubo mayor concurrencia y mejor debate de los participantes que trabajaron por mesas temáticas. En la ciudad de Quito el evento se realizó con mayor éxito que los dos anteriores, se desarrolló en el Ex senado de la Asamblea Nacional el 28 de noviembre y contó con la presencia del grupo parlamentario por la movilidad humana, así como representantes de Cancillería por cuanto con ellos se está coordinando la propuesta final de Ley de Movilidad Humana, el debate fue por mesas temáticas divididas en 4 grupos: refugio, inmigración, trata y tráfico y emigración, cada una con un moderador y sistematizador que en una matriz recoge todos los aportes de los participantes quienes forman parte del Estado, Sociedad Civil y buena presencia de organizaciones de base de migrantes y refugiados.</p> <p>En las provincias de El Oro, Esmeraldas y Loja se realizaron tres talleres locales con la finalidad de favorecer la participación de actores locales en este proceso de construcción del ante proyecto de ley de movilidad humana, estos se llevaron a cabo el 12 de noviembre simultáneamente en Esmeraldas y Machala. Para el 19 de noviembre se realizó el taller local en la ciudad de Loja. Todas estas actividades se desarrollaron desde la promoción de derechos.</p> <p>Con fecha 18 y 19 de noviembre se realizó una visita de monitoreo y seguimiento a la Delegación Provincial de Sucumbíos, como resultado de ello se elaboró un informe con las observaciones pertinentes y los compromisos asumidos por las respectivas partes para el seguimiento de los casos de movilidad humana que la Delegación ha recibido hasta la fecha del monitoreo.</p> <p>Para el 22 de noviembre estaba programada la reunión de la Mesa de Medios de Vida en la ciudad de Quito, espacio en el que participa la DPE con representación a través de la Dirección de Promoción.</p> <p>El 26 de noviembre, se realizó la reunión de la Mesa de Incidencia, espacio de articulación de varios actores principalmente de la sociedad civil donde se trataron temas de socialización del anteproyecto de ley de movilidad humana, articulación del trabajo que lleva adelante una consultora para la conformación de los Consejos Nacionales para la Igualdad y estrategias de incidencia en base al reporte de casos que cada institución enviará a la coordinadora de la mesa para la sistematización y el análisis de incidencia política que luego se hará.</p> <p>El 29 de noviembre se efectuó la reunión del equipo de ejecución del proyecto. Participaron de esta reunión 20 personas entre delegados, técnicos, comisionados regionales, asesores y el Adjunto Primero de la DPE, en esta reunión se presentó resumidamente el trabajo de cada provincia de intervención y posteriormente se hizo una evaluación con la metodología FODA.</p> <p>Con fecha 15 de noviembre, en la ciudad de Ibarra se realizó la reunión técnica de preparación para el Encuentro Binacional Ecuador Colombia 2014.</p>	<p>Vera Ayora, Mauricio</p>	<p>18/12/2013 - 09:41 AM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE: De acuerdo a la planificación establecida para el Fortalecimiento de Redes Locales, durante el mes de octubre se realizaron dos talleres. El primero en la ciudad de Lago Agrio en el auditorio del IESS, el 9 de octubre y el otro taller se realizó en la ciudad de Ibarra el 15 de octubre. En el caso del taller de Lago Agrio denominado "Socialización de las Competencias de la Defensoría del Pueblo a las organizaciones y entidades que trabajan por los derechos humanos y la movilidad humana en Sucumbíos" contó con la participación de organizaciones no gubernamentales y de cooperación como Asylum Acces, Acnur, Servicio Jesuita a Refugiados, HIAS, Consulado de Colombia, Misión Scalabriniana, Fundación Tarabita, Programa Mundial de Alimentos, Federación de Mujeres de Sucumbíos, RET, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, IESS, Comité de Derechos Humanos</p>	<p>Vera Ayora, Mauricio</p>	<p>05/11/2013 - 04:15 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>de Orellana, Junta Cantonal de Lago Agrio, MIES, Dirección de Educación de Sucumbíos, Consulado de Colombia, Dirección de Salud, Registro Civil, Dirección de Refugio. El taller de Ibarra se denominó "Socialización de las Competencias de la Defensoría del Pueblo a las organizaciones y entidades parte de la mesa de movilidad humana de Imbabura" el cual se realizó el 15 de octubre con la participación de organizaciones como Hias, Acnur, Misión Scalabriniana, Registro Civil, junta de protección de derechos de Ibarra, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ibarra , Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia de Otavalo, Junta de Protección de derechos de Otavalo , Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , Ministerio de Relaciones Exteriores Obarra, Care, Asylum Access, Foro de mujeres, Fundación mujer equidad y genero , Defensoría del pueblo, Delegación Imbabura. Ambos talleres tuvieron como finalidad dar a conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo para la remisión de casos de movilidad humana.</p> <p>El 28 de octubre del 2013 se mantuvo una reunión con la Gerente del Proyecto de Fortalecimiento a las Unidades de Control Migratorio Dra. Iroshima Villalba, además asistieron el ACNUR y la Dirección de Refugio, se trató los siguiente puntos: Nos manifestaron el interés de hacer los talleres sobre movilidad humana para el personal de Servicio Civil de Migración que es relativamente nuevo. Nos informaron que ya han intervenido la unidad de control migratorio en San Lorenzo - Esmeraldas, y que mantendrán el proceso que se venía llevando con respecto a la recepción de solicitudes de asilo; esta actividad la coordinarían con la Dirección de Refugio.</p> <p>La Dra. Iroshima Villalba nos invita a estar presente en uno de los controles que se hacen en el Aeropuerto de Tababela los días lunes y viernes a partir de las 04h00 am. Desde la DPE se envió una propuesta de temas para los talleres que sugerimos para que se realicen en los primeros días de diciembre. (ver adjunto)</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE: De acuerdo a la planificación establecida para el Fortalecimiento de Redes Locales, durante el mes de septiembre se realizaron dos talleres. El primero en la ciudad de Tulcán el 5 de septiembre y el otro taller se realizó en la ciudad de Guayaquil el 18 de septiembre. En el caso del taller de Tulcán, contó con la participación de organizaciones no gubernamentales y de cooperación como HIAS, ACNUR, Misión Scalabriniana, Asylum Access, Servicio Jesuita para Refugiados, entre otros. El taller de Guayaquil se realizó en la Delegación Provincial del Guayas con la participación de organizaciones de sociedad civil, cooperación y Estado. Ambos talleres tuvieron como finalidad dar a conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo para la remisión de casos de movilidad humana registrados en la matriz dentro del hito 47 con un total de 31 casos.</p> <p>En el marco de la Semana de Movilidad Humana, se realizó el día miércoles 11 de septiembre un Conversatorio en el ex Senado de la Asamblea Nacional denominado "Aportes y Desafíos para la Construcción de la Ley de Movilidad Humana" junto con representantes del Ministerio de Relaciones Laborales, Cancillería, de la Defensoría del Pueblo, GAD Provincial de Pichincha, Plataforma de Movilidad Humana, Grupos de Retornados, organismos internacionales (ACNUR, OIM), agencias de cooperación (GIZ) y una serie de organizaciones de la sociedad civil. Así también, en la ciudad de Guayaquil se realizó un conversatorio sobre el Proyecto de Ley de Movilidad Humana, dirigido a los miembros de la Mesa de Movilidad Humana, región Costa en la Delegación Provincial del Guayas.</p>	<p>Ramirez Chango, Daniela Alexandra</p>	<p>16/10/2013 - 03:08 PM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Debido a que uno de los principales ejes del Proyecto ACNUR es la realización de talleres para el Fortalecimiento de Redes Locales, durante el mes de agosto se realizaron dos eventos importantes. Uno en la ciudad de Quito el 14 de agosto y el otro taller se realizó en la ciudad de San Lorenzo el 22 de agosto. Ambos talleres contaron con la participación de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, cooperación y Estado, teniendo como finalidad dar a conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo para la remisión de casos de movilidad humana registrados en la matriz dentro del hito 37. En ejecución de otro importante eje para el año 2013 dentro del Proyecto ACNUR, con fecha 7 de agosto se realizó la contratación del Ab. Alfonso Javier Arcentales Illescas (RUC: 1714234273001) para la elaboración del Proyecto de Ley de Movilidad Humana. (El contrato de la Consultoría se encuentra registrado dentro del hito 35)</p> <p>En respuesta a la cantidad de usuarios que concurren a las Delegaciones Provinciales de Pichincha como a la Nacional se determinó la necesidad de contar con dos nuevas funcionarias que puedan contribuir en la atención de casos de personas en situación de movilidad humana y refugio, así como en la participación de redes locales y en la promoción de derechos para la protección de las personas en situación de movilidad. Las personas contratadas son: Ivón Catalina Pazmiño Viteri - Analista 3 (Fecha de contrato: 19 de agosto de 2013) y María Gabriela Alvear Olmedo - Asistente de Abogacía (Fecha de contrato: 2 de agosto de 2013) Por otra parte, la identificación de varias delegaciones que están inmersas en el proyecto, las cuales</p>	<p>Ramirez Chango, Daniela Alexandra</p>	<p>06/09/2013 - 05:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>corresponde a la Comisión Regional 1, determinan la necesidad de un monitoreo y seguimiento de las actividades de protección y promoción a nivel nacional, estableciendo la contratación de una tercera persona que brinde soporte al monitoreo mensual tanto de atención de casos como de fortalecimiento de las redes de movilidad humana. La persona contratada es la Srta. María Belén Díaz Ordoñez, en calidad de Analista 1 (Fecha de contrato: 2 de agosto de 2013).</p> <p>El Delegado Cantonal de San Lorenzo, Abg. Gandhi Gamboa con fecha 20 de agosto de 2013 presentó su renuncia a su calidad como delegado con grado 12.</p>		
<p>RESUMEN EJECUTIVO JULIO: Dentro de las actividades desarrolladas en el Proyecto ACNUR se contempló la realización de visitas a las localidades de Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán, Ibarra, Lago Agrio, El Coca, Guayaquil y Machala. El objetivo de estas visitas fue el de recoger información sobre la situación local de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana y refugio. La metodología que se utilizó para estas visitas fue el de ubicar a las organizaciones de sociedad civil y cooperación que trabajan en temas de movilidad humana y principalmente refugio a quienes se les preguntó sobre las principales vulneraciones a los derechos humanos de las personas e contextos de movilidad y la situación local. Dentro de las organizaciones con las que se mantuvo contacto estuvieron Misión Scalabriniana, HIAS (Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados), Asylum Access, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones para Refugiados), Servicio Jesuita de Refugiados, Fundación Esperanza, Mesa de Movilidad de la Región Costa, FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), Save the Children, Consejo Noruego, Federación de Mujeres de Sucumbios, entre otras organizaciones. El resultado de estas visitas es la elaboración de un diagnóstico situacional y ver los puntos álgidos respecto de los derechos violados para realizar estrategias de incidencia y promoción de derechos.</p> <p>Debido a los vacíos identificados en las visitas realizadas y a que se incorporaron nuevos funcionarios para trabajar en la Defensoría del Pueblo se realizó el Encuentro Nacional de las Delegaciones de la defensoría del Pueblo para la socialización del Proyecto ACNUR en el que participaron funcionarios de las provincias parte del Proyecto ACNUR (Esmeraldas, Sucumbios, Pichincha, Guayas, Tulcán, Imbabura); así como de provincias en las q</p>	<p>Guevara, Vanessa</p>	<p>06/09/2013 - 09:33 AM</p>
<p>RESUMEN EJECUTIVO JUNIO.- Con fecha 7 de junio de 2013 se validaron las cuentas y el presupuesto del Proyecto por parte del Ministerio de Finanzas, se adjunta Comprobante de Modificación Presupuestaria. (ANEXO SUBIDO DENTRO DE LOS HITOS COMO PRESUPUESTO)</p> <p>Contando con los fondos se inició la ejecución del Proyecto con el contratación del personal técnico, proceso en el que existió problemas debido a la falta de personal con los perfiles requeridos, se revisaron varias carpetas y se realizaron varias entrevistas en las ciudades de (QUITO, SAN LORENZO, LAGO AGRIO, GUAYAQUIL, IBARRA), e inclusive personas que inicialmente habían aceptado participar en el Proyecto nos dieron su negativa con posterioridad. En tal virtud se han realizado en el mes de junio las siguientes contrataciones:</p> <p>Mónica Flores- Abogado 2-Quito, fecha de contrato 13 de junio. Daniela Ramírez-Analista 3-Quito, fecha de contrato 13 de junio. Ghandy Gamboa-Delegado cantonal San Lorenzo, fecha de contrato 13 de junio. Andrea José Cevallos-Analista 1, en el caso de Andrea Cevallos debido a los problemas anteriormente señalados y por cuanto su perfil no cumplía con los requisitos para Analista 3 se la contrató como Analista 1-San Lorenzo, fecha de contrato 25 de junio.</p> <p>En cuanto a la ejecución técnica se realizó la siguiente visita a SUCUMBIOS(DOCUMENTO DE RESPALDO-INFORME LAGO AGRIO JUNIO-DENTRO DE LOS HITOS). Así mismo se ha planificado el cronograma de visitas para el mes de julio para realizar el levantamiento de información, así como la agenda de actividades que se realizarán.(EL DOCUMENTO ANEXO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS HITOS COMO CRONOGRAMA DE TRABAJO JUNIO), (LA SOLICITUD DE LOS VIATICOS SE ENCUENTRA SUBIDO DENTRO LOS HITOS COMO VIATICOS)</p> <p>En cuanto a la ejecución por pago del arriendo y servicios básicos se solicitarán las certificaciones presupuestarias de energía eléctrica, telecomunicaciones, edificios locales y residencias, para que se realicen estos pagos con cargo a los fondos del Proyecto, ya que son pagos que se los venía realizando con cargo al presupuesto de la Defensoría del Pueblo durante el tiempo que el proyecto estuvo en aprobación y hasta que los fondos se habiliten. (EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A CARGO DE LA DPE SE ENCUENTRA SUBIDO EN HITOS CON EL NOMBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-CARGO DPE)</p>	<p>Guevara, Vanessa</p>	<p>05/08/2013 - 12:44 PM</p>
<p>Mayo 2013</p>	<p>Villacís Yépez, María Cristina</p>	<p>06/06/2013 - 12:31 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>El proyecto ha tenido retrasos debido a que una vez que se obtuvieron las priorizaciones por parte de SETECI y SENPLADES, y más aún tomando en cuenta que ACNUR hizo la transferencia tan pronto fue habilitada la cuenta TE, el Ministerio de Finanzas no permitió que se utilicen los fondos mientras SENPLADES no envíe un oficio indicando la inclusión del proyecto en el PAI 2013.</p> <p>Las gestiones se hicieron inmediatamente, pero en la Subsecretaría de Inversión, no se dio paso inmediato a la gestión del trámite, por lo que no se ha podido ejecutar el proyecto tal como estaba previsto.</p> <p>El seguimiento al trámite persiste para solucionar este problema lo antes posible.</p>		
<p>Abril 2013 Se ingresó el proyecto solicitado a SENPLADES el 1ero de abril pero aún no hay respuesta de dicha institución por un valor total de \$200 000 (doscientos mil dólares americanos). Se realizó la firma del acuerdo entre la DPE y el ACNUR.</p> <p>Marzo 2013 Se realizó el proyecto en formato SENPLADES, se aprobó el presupuesto por parte de ACNUR, se realizaron los contactos con SETECI se aprobó el proyecto por SETECI. Se tuvieron algunos inconvenientes con ACNUR sobre el presupuesto, por lo que se tuvieron 3 reuniones más de las previstas. Se firmó la carta compromiso con ACNUR por 200 mil dólares.</p> <p>Febrero 2013 Se realizaron las reuniones de coordinación pertinentes al proyecto. Se definió el presupuesto del proyecto que será de 200 mil USD. El alcance del proyecto será para las provincias de Frontera Norte y para Guayaquil. Se elaboró el proyecto en formato ACNUR, se realizó el documento de presupuesto y el ante-proyecto en formato SETECY para la revisión de los coordinadores.</p> <p>Enero 2013 Se realizó el cierre del proyecto 2012, con el "anexo A" (formato ACNUR), reporte financiero* y se realizó el manual de incidencia para Frontera Norte. Además se realizó la continuación del proyecto ACNUR 2013, con el "anexo A" 2013, presupuesto ideal 2013 y el presupuesto de 115000 para la continuación del mismo. Adicionalmente se realizaron reuniones de coordinación para ver como quedaba establecido por la Defensoría del Pueblo el contrato de 3 técnicos para dar continuidad al proyecto así como la firma de los contratos de los mismos hasta el 31 de marzo del año en curso.</p> <p>Problemas surgidos; Se entregó después de la reunión mantenida con Veronica Jaramillo, Amparo Guanuña, Nataly Salgado y Marco Varese en la cual se acordó que la Coordinación de Incidencia e Investigación no podía realizar los reportes financieros, que era quienes estaban realizando el reporte financiero de julio (2) y octubre (1)) por lo que la Dirección Financiera era quien se encargaría de estos reportes (esto en el mes de octubre del 2012), teniendo como resultado la entrega tardía del último reporte que debería ser entregado a mediados del mes de enero, con la correspondencia mantenida el día 8 de enero del 2013 el reporte fue enviado el día 31 de enero con errores, por lo que se realizó un nuevo reporte por Amparo Guanuña, revisión por Marco Varese y Cristina Villacís y será firmado por el Director Financiero encargado José Luis Bastidas quien firmaría el día 20 de febrero para que así sea enviado el nuevo reporte sin los errores de gastos.</p>	Villacís Yépez, María Cristina	06/06/2013 - 12:25 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Hito 55: Remisión de casos desde las organizaciones de la sociedad civil	07/11/2013	María Cristina Villacís Yépez	50	80	40	0/1
2	Hitos 51 y 52: Taller para la socialización de la propuesta de ley de Movilidad Humana en la ciudad de Quito y Cuenca realizado (24 y 28/10/2013)	05/11/2013	María Cristina Villacís Yépez	30	20	6	0/0

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3	Hito 57: Taller de fortalecimiento en San Lorenzo	03/12/2013	María Cristina Villacís Yépez	80	80	64	0/0
4	Hito 58: Taller de fortalecimiento de redes locales - Tulcan	03/12/2013	María Cristina Villacís Yépez	80	80	64	0/0

Problemas cerrados: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.5. Seguridad. Aumento de violencia en la frontera CAUSARIA renuncia de personal, incremento en número de refugiados, cierre de la oficina en San Lorenzo	04/04/2013	María Cristina Villacís Yépez	80 %	90	72	0/1
2	2- EXTERNO.7. Otros. Posibles amenazas a personas atendidas por la Defensoría del Pueblo CAUSARÍA disminución de procesos defensoriales.	04/04/2013	Marco Varese	70 %	80	56	0/1
3	2- EXTERNO.6. Seguridad. Incremento del Conflicto Armado en la frontera Norte CAUSARIA Desplazamiento de Personas en Necesidad de Protección Internacional	04/04/2013	María Cristina Villacís Yépez	50 %	100	50	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
4	Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra
5	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio
6	Zona 1 - Norte > Zona 1 - Norte > Zona 1 - Norte (Toda la Zona)

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Ante proyecto elaborado y aprobado por las autoridades de la Defensoría del Pueblo.	0. Anteproyecto	13/01/2013		13/01/2013		Sí	1.5
2	Ante Proyecto diseñado en formato establecido por ACNUR	0. Anteproyecto	20/01/2013		20/01/2013		Sí	1.5
3	Manual de incidencia (Estrategias y cronograma)	0. Anteproyecto	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.5
4	Informe de actividades aprobado	0. Anteproyecto	15/02/2013		15/02/2013		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Reunión establecida con autoridades (Adjuntía 1ra) y áreas involucradas en proyecto para estimar detalles detalles.	0. Anteproyecto	18/02/2013		18/02/2013		Sí	1.5
6	Reunión con ACNUR para establecer alcance y costo del proyecto	1. Definición	21/02/2013		21/02/2013		Sí	1.5
7	Presupuesto enviado a ACNUR para aprobación	1. Definición	22/02/2013		22/02/2013		Sí	1.5
8	Reuniones definición proyecto de Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad.	1. Definición	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.5
9	Carta de intención de ACNUR con techo aprobado para el proyecto.	1. Definición	01/03/2013		01/03/2013		Sí	1.5
10	Proyecto elaborado en formato SENPLADES.	2. Planificación	01/03/2013		01/03/2013		Sí	1.5
11	Convenio firmado por la Defensoría del Pueblo y ACNUR para la elaboración del proyecto.	3. Ejecución	15/03/2013		15/03/2013		Sí	1.5
12	Proyecto ingresado al SIPEIP	2. Planificación	15/03/2013		15/04/2013		Sí	1.5
13	Proyecto aprobado por la SETECI	1. Definición	01/04/2013		01/04/2013		Sí	1.5
14	Proyecto priorizado por SENPLADES	1. Definición	15/04/2013		29/04/2013		Sí	2.0
15	Transferencia de fondo a la cuenta en el Banco Central de la DPE	3. Ejecución	25/04/2013		02/05/2013		Sí	2.0
16	Firma del Sub-acuerdo ACNUR-DPE	3. Ejecución	30/04/2013		29/04/2013		Sí	1.5
17	Contrato arrendamiento oficina de la Defensoría del Pueblo en San Lorenzo firmado inicio de pago proyecto ACNUR	3. Ejecución	02/05/2013		02/05/2013		Sí	1.5
18	Contrato de abogado firmado (San Lorenzo)	3. Ejecución	02/05/2013		13/06/2013		Sí	1.5
19	Contrato de especialista en promoción de derechos en firmado (San Lorenzo)	3. Ejecución	02/05/2013		25/06/2013		Sí	1.5
20	Contrato de Especialista en promoción de derechos firmado (Quito)	3. Ejecución	02/05/2013		13/06/2013		Sí	1.5
21	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Guayas)	3. Ejecución	02/05/2013		01/07/2013		Sí	1.5
22	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Imbabura)	3. Ejecución	02/05/2013		15/07/2013		Sí	1.5
23	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Lago Agrio)	3. Ejecución	02/05/2013		01/08/2013		Sí	1.5
24	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Quito)	3. Ejecución	02/05/2013		15/07/2013		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	Encuentro Nacional de las Delegaciones de la Defensoría del Pueblo para el Proyecto ACNUR	3. Ejecución	05/05/2013		31/07/2013		Sí	1.5
26	Reuniones con ACNUR y DPE en Quito	3. Ejecución	02/06/2013		18/06/2013		Sí	1.5
27	Reuniones con ACNUR y DPE en San Lorenzo	3. Ejecución	02/06/2013		07/08/2013		Sí	1.5
28	Evaluación y seguimiento de las actividades realizadas	3. Ejecución	15/06/2013		15/06/2013		Sí	1.5
29	Informes de visitas realizadas	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.5
30	Generación de herramientas técnicas para optimizar la capacidad técnica en materia de Promoción y Protección realizada	3. Ejecución	29/07/2013		29/07/2013		Sí	1.5
31	Fortalecimiento de la capacidad de gestión a los nuevos funcionarios contratados realizada	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.5
32	Socialización y aplicación de las herramientas técnicas para la identificación de ferias y talleres (Dirección de Promoción - Coordinación de Educación) realizada	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.5
33	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Quito realizado	3. Ejecución	14/08/2013		14/08/2013		Sí	1.5
34	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - San Lorenzo realizado (21/08/2013)	3. Ejecución	21/08/2013		22/08/2013		Sí	1.5
35	Contratación de consultor para la elaboración de la propuesta de ley de movilidad humana concluido	3. Ejecución	31/08/2013		07/08/2013		Sí	1.5
36	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Delegación Provincial Pichincha)- (19/08/2013)	3. Ejecución	31/08/2013		02/08/2013		Sí	1.0
37	Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.5
38	Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.5
39	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Guayas realizado (5/09/2013)	3. Ejecución	05/09/2013		18/09/2013		Sí	1.5
40	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Tulcán realizado (5/09/2013)	3. Ejecución	05/09/2013		05/09/2013		Sí	1.5
41	Avance de los diagnósticos de la situación de movilidad humana en la Frontera	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Norte y Guayas entregados (30/09/2013)							
42	Contratación de especialista para el seguimiento de la acción de protección y aplicación de los procesos defensoriales en las Provincias de Frontera Norte (02/08/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		02/08/2013		Sí	1.0
43	Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Delegación Provincial de Pichincha)- (02/08/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		02/08/2013		Sí	1.0
44	Estructura del Proyecto de Ley de Movilidad Humana entregado (30/09/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.5
45	Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana realizado (Dirección de Protección) (30/09/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.5
46	Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (30/09/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.5
47	Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (30/09/2013)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.5
48	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Sucumbíos realizado (2/10/2013)	3. Ejecución	02/10/2013		09/10/2013		Sí	1.5
49	Primer borrador de la propuesta de Ley de Movilidad Humana (15/10/2013)	3. Ejecución	15/10/2013		15/10/2013		Sí	1.5
50	Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Ibarra realizado (16/10/2013)	3. Ejecución	16/10/2013		15/10/2013		Sí	1.5
51	Taller para la socialización de la propuesta de ley de Movilidad Humana en la ciudad de Quito realizado (24/10/2013)	3. Ejecución	24/10/2013		28/11/2013		Sí	1.5
52	Taller para la socialización de la propuesta de ley de Movilidad Humana en la ciudad de Cuenca realizado (28/10/2013)	3. Ejecución	28/10/2013		14/11/2013		Sí	1.5
53	Avance de los diagnósticos de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (30/10/2013)	3. Ejecución	30/10/2013		18/10/2013		Sí	1.5
54	Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana (Dirección de Protección) entregado (31/10/2013)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.5
55	Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (31/10/2013)	3. Ejecución	31/10/2013		29/11/2013		Sí	1.5







HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
56	Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (31/10/2013)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.5
57	Taller para el fortalecimiento de redes locales - San Lorenzo realizado (6/11/2013)	3. Ejecución	06/11/2013		12/11/2013		Sí	1.5
58	Taller para el fortalecimiento de redes locales - Tulcán realizado (13/11/2013)	3. Ejecución	13/11/2013		19/11/2013		Sí	1.5
59	Borradores para revisión de diagnósticos sobre la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (29/11/2013)	3. Ejecución	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.5
60	Incorporación de criterios recogidos en los talleres de socialización de la propuesta de ley de movilidad humana entregado (29/11/2013)	3. Ejecución	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.5
61	Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana (Dirección de Protección) entregado (29/11/2013)	3. Ejecución	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.5
62	Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (29/11/2013)	3. Ejecución	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.0
63	Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (29/11/2013)	3. Ejecución	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.0
64	Encuentro Binacional Colombia-Ecuador (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
65	Diagnósticos finales de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (31/12/2013)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
66	Informe final Aprobado (consolidado acciones de promoción y protección)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
67	Informe final de talleres con redes locales realizado (promoción)	3. Ejecución	31/12/2013		26/12/2013		Sí	1.0
68	Informe final de visitas y seguimiento de casos realizado (protección)	4. Cierre	31/12/2013		26/12/2013		Sí	1.0
69	Lecciones Aprendidas	5. Post-proyecto	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
70	Producto final del proyecto de ley de movilidad humana entregado (31/12/2013)	4. Cierre	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de diagnósticos realizados		100.00 %	5	5	02/01/2013	Jul-Dic

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
2	Número de casos remitidos en temas de movilidad humana.		133.33 %	21	28	02/01/2013	Jul-Dic
3	Número de Contratos de personal de protección y promoción		366.67 %	3	11	02/01/2013	Jul-Dic
4	Número de funcionario capacitados		108.57 %	35	38	02/01/2013	Jul-Dic
5	Número de funcionarios o funcionarias especializadas en el procesamiento de casos de personas en situación de movilidad.		333.33 %	3	10	02/01/2013	Jul-Dic
6	Número de redes creadas o fortalecidas		100.00 %	6	6	02/01/2013	Jul-Dic
7	Porcentaje de casos remitidos en temas de movilidad humana.		178.18 %	110	196	02/01/2013	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	200,000.00 **
Costo Total:	200,000.00
Total Devengado:	169,946.83
% Costo Total Devengado:	84.97 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.97 %

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2013)		200,000.00		
Ppto. Programado	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Ppto. Devengado	0.00	169,946.83	0.00	169,946.83
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	84.97 %	0.00 %	84.97 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

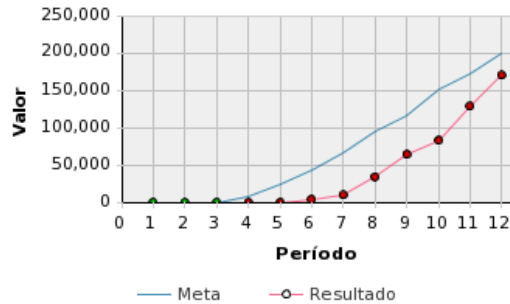

Presupuesto Mensual 2013								
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual	
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Abr	6,871.78	0.00	6,871.78	0.00	0.00 %	●	0.00 %	
May	17,761.33	0.00	24,633.11	0.00	0.00 %	●	0.00 %	

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	18,381.33	3,712.81	43,014.44	3,712.81	8.63 %		1.86 %
Jul	21,741.33	5,695.42	64,755.77	9,408.23	14.53 %		4.70 %
Ago	29,662.83	24,261.67	94,418.60	33,669.90	35.66 %		16.83 %
Sep	21,553.83	30,512.42	115,972.43	64,182.32	55.34 %		32.09 %
Oct	34,323.83	19,015.22	150,296.26	83,197.54	55.36 %		41.60 %
Nov	22,317.17	45,094.81	172,613.43	128,292.35	74.32 %		64.15 %
Dic	27,386.57	41,654.48	200,000.00	169,946.83	84.97 %		84.97 %
Total	200,000.00	169,946.83					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar las estrategias con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza para incidir en políticas públicas MEDIANTE la participación en reuniones interinstitucionales en materia de derechos humanos y de la naturaleza; la generación de convenios para la promoción de derechos humanos y de la naturaleza; y, el fortalecimiento y trabajo con redes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Informe Esmeraldas - San Lorenzo julio.doc	Hito 29: Informes de visitas realizadas	05/08/2013
2	Casos remitidos OSC.odt	Hito 55: Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (31/10/2013)	05/12/2013
3	Casos remitidos OSC.odt	Hito 62: Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (29/11/2013)	05/12/2013
4	Matriz para definir la participacion en ferias o talleres.doc	Hito 32: Socialización y aplicación de las herramientas técnicas para la identificación de ferias y talleres (Dirección de Promoción - Coordinación de Educación) realizada	05/08/2013
5	Informe Lago Agrio-JUNIO.doc	INFORME LAGO AGRIO JUNIO.	04/07/2013
6	Scan 001.pdf	Hito 31: Fortalecimiento de la capacidad de gestión a los nuevos funcionarios contratados realizada	13/12/2013
7	Informe general de actividades mes de Junio 2013 (1).docx	Hito 28: Evaluación y seguimiento de las actividades realizadas	05/08/2013
8	Justificación Demora en Proyecto ACNUR (3).pdf	Hito 27: Reuniones con ACNUR y DPE en San Lorenzo	05/08/2013
9	CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINA SAN LORENZO-CARGO ACNUR.pdf	CONTRATO DE ARRIENDO-CARGO DPE	08/07/2013
10	Contrato Andrea Cevallos (1).pdf	Hito 19: Contrato de especialista en promoción de derechos en firmado (San Lorenzo)	05/08/2013
11	Cronograma actividades Julio.doc	Hito 31: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los nuevos funcionarios contratados	08/07/2013
12	MATRIZ SEGUIMIENTO DE CASOS MOVILIDAD HUMANA (herramienta de protección).xls	Hito 30: Generación de herramientas técnicas para optimizar la capacidad técnica en materia de Promoción y Protección realizada	05/08/2013
13	Justificación Demora en Proyecto ACNUR.pdf	Hito 24: Delegaciones de la DPE, de las provincias en las cuales interviene el proyecto visitadas	08/07/2013
14	Contrato Daniela Ramírez.pdf	Hito 20: Contrato de Especialista en promoción de derechos firmado	08/07/2013
15	Contrato Luis Sanchez.pdf	Hito 21: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Guayas)	09/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
16	ORDENANZA_M._H[1].pdf	Hito 65: Diagnósticos finales de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (31/12/2013)	18/12/2013
17	Contrato Mónica Flores (1).pdf	Hito 24: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Quito)	05/08/2013
18	Contrato Gandhi Gamboa.pdf	Hito 18: Contrato de abogado en San Lorenzo Firmado	08/07/2013
19	Memoria evento 31 de julio y 1 de agosto 2013.doc	Hito 25: Encuentro Nacional de las Delegaciones de la Defensoría del Pueblo para el Proyecto ACNUR	05/08/2013
20	Contrato de arrendamiento San Lorenzo.pdf	Hito 17: Contrato arrendamiento oficina de la Defensoría del Pueblo en San Lorenzo firmado inicio de pago proyecto ACNUR	06/09/2013
21	SOCIOS ACNUR 18062013 (1).doc	Hito 26: Reuniones con ACNUR y DPE en Quito	05/08/2013
22	MATRIZ SEGUIMIENTO DE CASOS MOVILIDAD HUMANA.ods	Hito 37: Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado	04/09/2013
23	Scan 001.pdf	Hito 8: reuniones y cronograma	07/03/2013
24	Scan 001-1.pdf	Hito 8: reuniones y cronograma	07/03/2013
25	2.- Segundo Informe Narrativo final (Re. BV) (1).doc	Hito 66: Informe final Aprobado (consolidado acciones de promoción y protección)	07/01/2014
26	4.- Diagnostico por derechos y por provincias_Mauricio (re. BV) (1) (1).doc	Hito 65: Diagnósticos finales de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (31/12/2013)	09/01/2014
27	Condensado de casos octubre 2013.xls	Hito 56: Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (31/10/2013)	05/11/2013
28	Memoria evento 14 de agosto de 2013.doc	Hito 33: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Quito realizado	04/09/2013
29	Estructura de la LIMH.doc	Hito 44: Estructura del Proyecto de Ley de Movilidad Humana entregado (30/09/2013)	04/10/2013
30	Informe visita de Protección a Lago Agrio del 2 y 3 de septiembre de 2013.doc	Hito 45: Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana realizado (Dirección de Protección) (30/09/2013)	04/10/2013
31	Mail casos remitidos sept ONG a DPE.pdf	Hito 46: Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado (30/09/2013)	04/10/2013
32	Condensado de casos septiembre 2013.xls	Hito 47: Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (30/09/2013)	04/10/2013
33	Presupuesto ACNUR_DPE_2013_enviado 1_mar_2013.xlsx	Hito 7: Presupuesto enviado a ACNUR para aprobación	05/03/2013
34	Memoria evento Lago Agrio 9 de octubre de 2013.doc	Hito 48: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Sucumbíos realizado (2/10/2013)	21/10/2013
35	Contrato Consultor Ley de Movilidad Humana Javier Arcentales.pdf	Hito 35: Contratación de consultor para la elaboración de la propuesta de ley de movilidad humana concluido	04/09/2013
36	Memoria evento Ibarra 15 de octubre de 2013.doc	Hito 50: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Ibarra realizado (16/10/2013)	21/10/2013
37	Memoria evento San Lorenzo 22 de agosto de 2013.doc	Hito 34: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - San Lorenzo realizado (21/08/2013)	04/09/2013
38	FICHA DE REMISION DE CASOS A LA DEFENSORIA.doc	Hito 37: Reporte de casos remitidos de las organizaciones de la sociedad civil a la DPE entregado	04/09/2013
39	Diagnosticos por Derechos.docx	Hito 53: Avance de los diagnósticos de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (30/10/2013)	21/10/2013
40	Matrices diagnostico primer borrador.docx	Hito 41: Avance de los diagnósticos de la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (30/09/2013)	21/10/2013
41	Anexo A proyecto Defensoria 2013 (1).docx	Hito 2: documento Anteproyecto en formato ACNUR después de las reuniones con ACNUR y DPE para definir presupuesto.	05/03/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
42	Plan de Gestión de Riesgos ACNUR R3.doc	Riesgo 3 ACNUR: Incremento del Conflicto Armado en la frontera Norte CAUSARIA Desplazamiento de Personas en Necesidad de Protección Internacional	05/04/2013
43	PRESUPUESTO JUNIO.pdf	Hito 7: PRESUPUESTO JUNIO	03/07/2013
44	cronograma_actividades_julio.doc	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO	03/07/2013
45	Reunión con ACNUR el 5 de agosto de 2013.doc	Hito 27: Reuniones con ACNUR y DPE en San Lorenzo	06/09/2013
46	info de reunion_01.pdf	Hito 26: Reuniones con ACNUR y DPE QUITO; reunión con el Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades de Control Migratorio	05/11/2013
47	Contrato Luis Mario Rodriguez.pdf	Hito 23: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Lago Agrio)	06/09/2013
48	Hito 51 y 52_justificación.pdf	Hito 51 y 52: justificativo	05/11/2013
49	Plan de Gestión de Riesgos ACNUR R1.doc	Riesgo 1 ACNUR: Aumento de violencia en la frontera CAUSARIA renuncia de personal, incremento en número de refugiados, cierre de la oficina en San Lorenzo	05/04/2013
50	Plan de Gestión de Riesgos ACNUR R2.doc	Riesgo 2 ACNUR: Posibles amenazas a personas atendidas por la Defensoría del Pueblo CAUSARÍA disminución de procesos defensoriales.	05/04/2013
51	Acuerdo firmado 2013 (4).pdf	Hito 16: Acuerdo entre DPE y ACNUR firmado continuación 3	29/04/2013
52	Acuerdo firmado 2013 (3).pdf	Hito 16: Acuerdo entre DPE y ACNUR firmado continuación 2	29/04/2013
53	Informe visita a Lago Agrio del 8 y 9 de octubre de 2013.doc	Hito 48: Taller para el fortalecimiento de redes locales Sucumbíos	05/11/2013
54	Acuerdo firmado 2013 (2).pdf	Hito 16: Acuerdo entre DPE y ACNUR firmado continuación 1	29/04/2013
55	Hito 54 Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana_San Lorenzo_31 de oct 2013.doc	Hito 54: Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana_San Lorenzo y Esmeraldas (31/10/2013)	05/11/2013
56	Contrato Ivon Pazmiño.pdf	RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Contrato Ivon Catalina Pazmiño Viteri, Analista 3 (Delegación Provincial Pichincha)	05/09/2013
57	1.- MANUAL DE INCIDENCIA ATENCIÓN DE CASOS DE MOVILIDAD HUMANA (Adjuntía Primera).docx	Hito 3: Manual de incidencia (Estrategias y cronograma). Es un borrador no oficial, para el 2014 se lo terminará de elaborar y aprobar	27/12/2013
58	Informe visita a Ibarra del 14 y 15 de octubre de 2013.doc	Hito 54: Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana Ibarra entregado (31/10/2013)	05/11/2013
59	Acuerdo firmado 2013.pdf	Hito 16: Acuerdo entre DPE y ACNUR firmado	29/04/2013
60	Contrato M. Gabriela Alvear.pdf	RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Contrato de María Gabriela Alvear, Asistente de Abogacía (Delegación Provincial Pichincha)	05/09/2013
61	Informe visita a Lago Agrio del 8 y 9 de octubre de 2013.doc	Hito 54: Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana Lago Agrio entregado (31/10/2013)	05/11/2013
62	Ficha_Proyeto-1 SIPEIP.pdf	Hito 12: SIPEIP	29/04/2013
63	Contrato Maria B Diaz.pdf	RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO: Contrato de María Belén Díaz, Analista 1 (Comisión Regional 1)	05/09/2013
64	Oficio Seteci.pdf	Hito 13: aprobación de la SETECI	04/04/2013
65	Proyecto ACNUR 6_marzo_2013-1.docx	Hito 10: Proyecto en formato SENPLADES	04/04/2013
66	acnur_5_marzo_2013-1.pdf.htm	Hito 11: Convenio firmado (Carta de compromiso)	04/04/2013
67	Transferencia ACNUR.pdf	Hito 15_ Transferencia de fondos por parte de ACNUR	06/06/2013
68	Diagnosticos por Derechos.docx	Hito 59: Borradores para revisión de diagnósticos sobre la situación de movilidad humana en la Frontera Norte y Guayas entregados (29/11/2013)	06/12/2013
69	Lecciones aprendidas (cierre de proyecto).docx	Hito 69: Lecciones aprendidas	05/01/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
70	Final LIMH.pdf	Hito 70: Producto final del proyecto de ley de movilidad humana entregado (31/12/2013)	05/01/2014
71	Oficio SENPLADES Actualización Dictamen de Prioridad-1.pdf	Hito 14 - Oficio de priorización SENPLADES	06/06/2013
72	JUSTIFICACION PROYECTO ACNUR.pdf	JUSTIFICACIÓN PROYECTO ACNUR MAYO 2013	06/06/2013
73	Informe estadístico de casos atendidos hasta diciembre 2013.odt	Hito 68: Informe final de visitas y seguimiento de casos realizado (protección)	27/12/2013
74	Informe final actividades DINAPROT (ACNUR).odt	Hito 68: Informe final de visitas y seguimiento de casos realizado (protección)	27/12/2013
75	informe de redes locales.pdf	Hito 67: Informe final de talleres con redes locales realizado (promoción)	27/12/2013
76	Informe visita a Loja el 18 y 19 de noviembre de 2013.pdf	Hito 58: Taller para el fortalecimiento de redes locales - Tulcán realizado (13/11/2013)	03/12/2013
77	Informe taller Ley de MH Esmeraldas 11 y 12 Nov 2013.pdf	Hito 57: Taller para el fortalecimiento de redes locales - San Lorenzo realizado (6/11/2013)	03/12/2013
78	memoria de reunión técnica_preparación encuentro binacional.pdf	Hito 64: Encuentro Binacional Colombia-Ecuador (Informe)	03/12/2013
79	Contrato Lenin Daza.pdf	Hito 20: Contrato de Especialista en promoción de derechos firmado (Quito)	09/08/2013
80	Informe visita a El Oro el 11 y 12 de noviembre de 2013.pdf	Hito 58: Taller para el fortalecimiento de redes locales - Tulcán realizado (13/11/2013)	03/12/2013
81	Fernanda Espinoza.pdf	Hito 22: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Imbabura)	09/08/2013
82	Condensado de casos noviembre 2013.xls	Hito 63: Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado (29/11/2013)	03/12/2013
83	Condensado de casos agosto 2013.xls	Hito 38: Reporte de seguimiento de casos sobre movilidad humana entregado	13/12/2013
84	Scan 002.pdf	Hito 31: Fortalecimiento de la capacidad de gestión a los nuevos funcionarios contratados realizada	13/12/2013
85	BASE DE DATOS DE MOVILIDAD HUMANA 2013.xls	Hito 30: Generación de herramientas técnicas para optimizar la capacidad técnica en materia de Promoción y Protección realizada	13/12/2013
86	informe Javier Arcentales.docx	Hito 60: Incorporación de criterios recogidos en los talleres de socialización de la propuesta de ley de movilidad humana entregado (29/11/2013)	03/12/2013
87	Matriz para definir la participacion en ferias o talleres.doc	Hito 30: Generación de herramientas técnicas para optimizar la capacidad técnica en materia de Promoción y Protección realizada	13/12/2013
88	FICHA DE REMISION DE CASOS A LA DEFENSORIA.doc	Hito 30: Generación de herramientas técnicas para optimizar la capacidad técnica en materia de Promoción y Protección realizada	13/12/2013
89	Informe visita Taller Ibarra 14 y 15 de octubre.doc	Hito 50: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Ibarra realizado (16/10/2013)	13/12/2013
90	contrato_Ab. Mauricio Vera.pdf	Hito 20: Contrato de Especialista en promoción de derechos firmado	04/11/2013
91	Ante proyecto Preliminar de la Ley Orgánica Integral de Movilidad Humana.pdf	Hito 49: primer borrador de proyecto de la Ley de Movilidad Humana	01/11/2013
92	JUSTIFICACIÓN HITOS JUNIO-PROYECTO ACNUR.pdf	JUSTIFICACIÓN HITOS 29 Y 31	05/07/2013
93	Contrato M. Gabriela Alvear.pdf	Hito 43: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Delegación Provincial de Pichincha)- (02/08/2013)	30/09/2013
94	Memoria evento Tulcán 5 de septiembre de 2013.doc	Hito 40: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Tulcán realizado (5/09/2013)	30/09/2013
95	Contrato Maria Belen Diaz.pdf	Hito 42: Contratación de especialista para el seguimiento de la acción de protección y aplicación de los procesos defensoriales en las Provincias de Frontera Norte (02/08/2013)	30/09/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
96	Memoria evento Guayaquil 18 de septiembre de 2013.doc	Hito 39: Taller para el fortalecimiento de redes locales y competencias de la DPE - Guayas realizado (5/09/2013)	30/09/2013
97	Ante proyecto de ley mh con aportes de cuenca y guayaquil.docx	Hito 60: Incorporación de criterios recogidos en los talleres de socialización de la propuesta de ley de movilidad humana entregado (29/11/2013)	03/12/2013
98	18.- INFORME SUCUMBIOS PROYECTO ACNUR NOVIEMBRE.doc	Hito 61: Informe de visitas realizadas para monitoreo de casos de movilidad humana (Dirección de Protección) entregado (29/11/2013)	03/12/2013
99	Contrato Ivon Pazmiño.pdf	Hito 36: Contrato de especialista en protección de derechos firmado (Delegación Provincial Pichincha)- (19/08/2013)	30/09/2013
