

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente

PROYECTO: CDN G002 Gestión Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente

Líder del Proyecto:	Cárdenas Valladares, Alexandra (mcardenas@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Guaranda Mendoza, Wilton	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.01 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	40,767.44
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	20/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Pérez, Nicole	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Incrementar el nivel de protección de Derechos de la Naturaleza y Ambiente a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos defensoriales en las delegaciones provinciales.

Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, peticiones de amnistía, indultos, demandas de inconstitucionalidad, garantías constitucionales e infoermes sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.

Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales en Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.

Beneficios Cualitativos

Garantizar de forma más eficaz los Derechos de la Naturaleza y Ambiente.

Evidenciar la postura de la Defensoría del Pueblo en temas de Derechos de la Naturaleza y Ambiente, a través de sus resoluciones defensoriales conteniendo una alta calidad jurídica.

Restricciones

COSTO: \$ 13.800.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

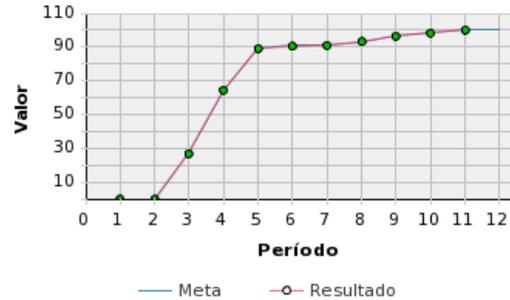

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	27 %	64 %	89 %	91 %	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	27 %	64 %	89 %	90 %	91 %	94 %	96 %	98 %	100 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Noviembre: Se culminó con la fase presencial de los Talleres de Derechos de la Naturaleza y Ambiente realizados con SEDEFA (Soporte información Hito 31 y 32). Se realizó un viaje a la provincia del Guayas para reforzar capacitación sobre el manejo del Siged, así como para verificar problemas presentados al ingresar información al sistema.</p>	Torres Villalba, Olga Andrea	16/12/2013 - 03:22 PM
<p>Octubre: Talleres de capacitación SIGED Delegaciones Napo, Pastaza, Loja, Zamora, Santo Domingo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Santa Elena, Los Ríos (hitos 23, 25, 26) Producto Final de Manual de Normas y Jurisprudencia (consultoría) (hito 24) Talleres de SEDEFA, Mindo, Santa Elena, Cayambe</p> <p>Septiembre: Talleres de capacitación de SIGED en las delegaciones provinciales de Morona Santiago, El Oro, Carchi, Imbabura, Orellana y Sucumbíos.</p> <p>Agosto: Se llevó a cabo el Taller de SIGED con funcionarios y funcionarias de la Delegación Provincial de Pichincha, reuniones de planificación de Talleres de SIGED para las delegaciones Provinciales de la DPE. Planificación de Talleres de Derechos de la Naturaleza en convenio con SEDEFA. Los hitos 6, 7, 8 se han puesto cumplidos, estos no se realizaron en los meses correspondientes, sino posteriormente por lo señalado en el resumen del mes de marzo.</p> <p>Julio: Se recibió el primer producto del manual de normas y jurisprudencia de derechos de la naturaleza (19/07/13) Se realizó el Taller para los funcionarios y funcionarias de la DINAPROT en el nuevo sistema SIGED. (04/07/13) Como seguimiento al caso de bananeras se realizó una reunión en las oficinas de la Delegación Provincial del Guayas en la cual participó el señor Defensor, la Delegada del Guayas, el Comisionado Regional 2, una funcionaria de CNDNA y los trabajadores afectados.</p> <p>Junio: Suscripción del contrato de Consultoría para elaborar el "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente". Informe de Viajes de seguimiento a casos de la Coordinación Nacional de Naturaleza y Ambiente.</p> <p>Mayo: Se remiten los documentos habilitantes de la Consultora para iniciar el proceso de contratación directa para la elaboración del "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente" No se realizaron viajes en el mes de mayo por problemas presupuestarios.</p> <p>Abril:</p>	Guevara, Vanessa	27/11/2013 - 10:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Se realizo las visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos de competencia de la Dirección en las provincias de Guranda y Lago Agrio.</p> <p>Respecto a la Consultoría (Hito 4), la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, a través de la Coordinación Nacional de Naturaleza y Ambiente, inició el proceso de contratación de la consultoría para elaborar el "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente". Mediante Resolución No. 062-DPE-DNJ-2013-PMC, el 05 de abril de 2013, se resuelve declarar desierto el proceso de contratación de la consultoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que se inició nuevo proceso para la contratación de otro consultor. Los talleres fueron reprogramados para el II Cuatrimestre (Hitos 6 y 7).</p> <p>Marzo: El consultor que había sido designado para el proceso de consultoría se retracto provocando que el proceso se declare desierto y deba ser iniciado nuevamente.</p> <p>Febrero: Conforme lo planificado para este mes, se procedió a dictar los talleres de capacitación para el fortalecimiento institucionales en las regionales de la DPE, a los cuales asistieron los coordinadores de la Direccion Nacional de Protección.</p> <p>Enero: Propuesta y aprobación para la elaboración de manual de normas y jurisprudencia enviada al Ajunto Primero, Asesor del Defensor y Directora de Protección</p>		
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación Nacional de la Naturaleza y Ambiente. Fuente: POA aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 05:07 PM

Problemas cerrados: 8

Riesgos cerrados: 9

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013.	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.0
3	Elab y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente. -Elab y present de losTDR realizar la consult de Elab"Manual de Normas y Jurisp de Derech. de la Nat y Ambiente" marzo	3. Ejecución	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0
4	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Reunión de trabajo para generar agenda para la construcción de los procesos de la Dirección de Protección-marzo (Informe)	3. Ejecución	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	12.5
6	Elaboración y Socialización del Manual de normas y jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente - Elaboración de contenidos del manual de normas y jurisprudencia relativos a Naturaleza y Ambiente - marzo (borrador Manual)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	12.5
7	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	12.5
8	Elaboración y Socialización del Manual de normas y jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente - elaboración de contenidos del manual de normas y jurisprudencia relativos a Naturaleza y Ambiente -abril (borrador Manual)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	12.5
9	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente abril (Manual)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	12.5
10	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	12.5
11	Elab. y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente.-Inicio proceso de la consultoría para la elab del "Manual de Normas y Jurisp de Derechos de la Nat y Ambien" mayo	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
12	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente mayo (Manual)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	11.0
13	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		06/08/2013		Sí	0.5
14	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Diagramación de los procesos defensoriales	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	defenidos y sistematizados junio (Informe)							
15	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente. Elaboración de contenidos de los manuales de procedimientos. junio (Manual)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.5
16	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente. Elaboración de contenidos de los manuales de procedimientos. julio (Manual)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
17	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente Talleres de capacitación para funcionarios (as) de la Dirección Nacional de Protec en el manejo del nuevo sistema de gestión defens agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
18	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente- Entrega primer producto de la consult para la elab. del "Manual de Normas y Jurisp de Derech. de la Nat y Amb" agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
19	Capacitar por medio de talleres zonales sobre la implementación de herramientas tutelares (Siged)- Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.0
20	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Talleres de capacitación para funcionarios(as) de la Dirección Nacional de Protec en el manejo del nuevo sistema de gestión defensorial septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
21	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente Ent segundo producto de la consultoría para la elaboración del "Manual de Normas de Jurisp de Derech de la Naty Amb"-septiembre(Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
22	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente. Elaboración de contenidos de los manuales de procedimientos. Talleres SIGED septiembre (Manual)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
23	Capacitar por medio de talleres zonales sobre la implementación de	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	herramientas tutelares (Sigid)- Octubre (Informe)							
24	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Entrega producto final de la consultoría para la elaboración "Manual de Normas de Jurisp de Derech de la Nat y Amb" octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
25	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Talleres de capacitación para funcionarios(as) de la Dirección Nacional de Protección en el manejo del nuevo sistema de gestión defensorial octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
26	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente. Elaboración de contenidos de los manuales de procedimientos.Talleres SIGED octubre (Manual)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
27	Talleres planificados en convenio con SEDEFA- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
28	Capacitar por medio de talleres zonales sobre la implementación de herramientas tutelares (Sigid)- Noviembre(Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.2
29	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Nat y Ambiente -Talleres de capacitación para funcionarios (as) de la Dirección Nacional de Protección en el manejo del nuevo sistema de gestión defensorial noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.2
30	Elaboración y socialización de contenidos de un manual sobre derechos de la Naturaleza y Ambiente. Elaboración de contenidos de los manuales de procedimientos.Talleres SIGED noviembre (Manual)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
31	Fortalecimiento a los Derechos de la Naturaleza a nivel nacional- noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		29/11/2013		Sí	0.2
32	Talleres planificados en convenio con SEDEFA- Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.4

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	40,767.44 **
Costo Total:	40,767.44
Total Devengado:	31,061.65
% Costo Total Devengado:	76.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 76.19 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	23,440.00	0.00	23,440.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	23,440.00	0.00	23,440.00
Ppto. Codificado	0.00	40,767.44	0.00	40,767.44
Planeado - Codificado (2013)		-17,327.44		
Ppto. Programado	0.00	40,767.44	0.00	40,767.44
Ppto. Devengado	0.00	31,061.65	0.00	31,061.65
Estimado a fin de año	* 0.00	40,767.44	0.00	40,767.44
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	76.19 %	0.00 %	76.19 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	380.00	0.00	380.00	-100.00 %	🔴	0.93 %
Feb	760.00	720.00	760.00	1,100.00	144.74 %	🔴	2.70 %
Mar	800.00	400.00	1,560.00	1,500.00	96.15 %	🟢	3.68 %
Abr	6,000.00	818.12	7,560.00	2,318.12	30.66 %	🔴	5.69 %
May	760.00	487.13	8,320.00	2,805.25	33.72 %	🔴	6.88 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	7,186.40	855.58	15,506.40	3,660.83	23.61 %		8.98 %
Jul	5,000.00	357.80	20,506.40	4,018.63	19.60 %		9.86 %
Ago	0.00	4,627.75	20,506.40	8,646.38	42.16 %		21.21 %
Sep	2,984.00	3,693.20	23,490.40	12,339.58	52.53 %		30.27 %
Oct	7,961.00	9,050.71	31,451.40	21,390.29	68.01 %		52.47 %
Nov	9,316.04	8,353.95	40,767.44	29,744.24	72.96 %		72.96 %
Dic	0.00	1,317.41	40,767.44	31,061.65	76.19 %		76.19 %
Total	40,767.44	31,061.65					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar el nivel de protección de Derechos de la Naturaleza y Ambiente a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos defensoriales en las delegaciones provinciales.
2	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, peticiones de amnistía, indultos, demandas de inconstitucionalidad, garantías constitucionales e informes sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.
6	Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales en Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Taller noviembre_2013.pdf	Hito 31, 32	04/12/2013
2	Informe Seguimiento de caso Totoracocha_02013.pdf	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
3	Viajes Naturaleza.xls	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
4	Taller Baños_2013.pdf	Hito 31, 32	04/12/2013
5	Informe Taller SIGED 25 09_2013.pdf	Hito 19, 20, 22	07/10/2013
6	Informe Taller SIGED 17 09_2013.pdf	Hito 19, 20, 22	07/10/2013
7	Acta Entrega Recepcion Definitiva 14 09_2013.pdf	Hito 21	07/10/2013
8	Mail presentación Informe a Salango20130403_10000304.pdf	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
9	Visitas In Situ_ Mayo2013_ Naturaleza.xls	HITO 10	06/09/2013
10	Mail presentación Informe a Esmeraldas20130403_10091809.pdf	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
11	Informe Visita In Situ_02013.pdf	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
12	Informe Visita a Delegaciones_02013.pdf	Viajes realizados por la Coordinación de Naturaleza y Ambiente de visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos.	06/08/2013
13	Resolucion No 062 DPE DNJ 2013 PMC_00001.pdf	Resolución declarando desierto el proceso de consultoría mediante Contratación Directa	06/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
14	CONTRATO No DPE 2013 PCJ_02013.pdf	Contrato Suscrito para la Consultoría para la elaboración del "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de Naturaleza y Ambiente	06/08/2013
15	TDRs_0001.pdf	Terminos de Referencia para la contratación directa de la consultoría para la elaboración del "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente"	06/08/2013
16	Memorando Nro DPE DNA 2013_00406.pdf	Declaratoria de desierto proceso de contratación consultoría	06/08/2013
17	Manual de normas y jurisprudencia de derechos de la naturaleza y ambiente (punteo).docx	Primer producto del "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente" presentado por la Consultora	06/08/2013
18	Memorando Nro DPE DNPDHN 2013_00248.pdf	H Memorando solicitando reprogramación valores relacionados con los talleres de capacitación en el nuevo sistema de gestión defensorial	06/08/2013
19	Memorando Nro DPE CNDNA 2013_080.pdf	Proyecto de Gasto Corriente G002 hito 19	09/09/2013
20	TDR nuevo proceso de contratacion_02013.pdf	Terminos de Referencia para la contratación directa de la consultoría para la elaboración del "Manual de Normas y Jurisprudencia de Derechos de la Naturaleza y Ambiente" en el nuevo proceso	06/08/2013
21	Memorando Nro DPE CNDNA 2013_00012.pdf	Memorando remitiendo a la Dirección Administrativa los Términos de Referencia para la consultoría	06/08/2013
22	ANEXOS TERCERA VISITA REGIONAL 5.xls	HITO 2	05/03/2013
23	Memorando Nro DPE DNPDHN 2013_00119.pdf	Memorando solicitando Contratación para Consultoría	06/08/2013
