

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

PROYECTO: **DTD G001** Gestión Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Anchundia Ávila, María Alexandra (aanchundia@dpe.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo | Programas Relacionados: | |
| Titular: | | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 710.00 |
| Localidad de Gestión : | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| Fecha de Última Actualización: | 13/01/2014 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Ortiz Vivas, Ana Lucia | Fecha del siguiente Hito: | |


DATOS GENERALES

| |
|--|
| Descripción |
| La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013 |
| Beneficios Cualitativos |
| Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza |
| Restricciones |
| COSTO: \$ |
| TIEMPO: 12 meses |
| ALCANCE: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

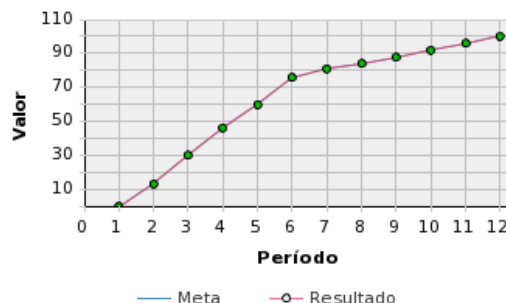

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2013 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 13 % | 30 % | 46 % | 60 % | 76 % | 81 % | 84 % | 88 % | 92 % | 96 % | 100 % | |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | | |

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | 0 % | 13 % | 30 % | 46 % | 60 % | 76 % | 81 % | 84 % | 88 % | 92 % | 96 % | 100 % |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 19 y 20 de diciembre del 2013 Realización de Operativo para garantizar derechos del consumidor por la venta de bienes promocionales en época navideña, actividad realizada en coordinación con Salud SRI, Intendencia y Comisarias de Policía. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/01/2014 - 01:34 PM |
| 11 de diciembre del 2013 Realización de Cine Foro sobre Desapariciones involuntarias con participación de Fiscalía, Ministerio del Interior y estudiantes de Derechos. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/01/2014 - 01:30 PM |
| 10 de diciembre del 2013 Realización de Feria "Tiempo de Derechos" actividad realizada en conjunto con la Comisión Regional 5 , donde participaron varias instituciones Locales y estudiantes de diferentes entidades educactivas | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/01/2014 - 01:29 PM |
| 5 de diciembre de 2013 Visita a Fiscalía de la Concordia a fin de verificar expedientes en vigilancia del debido proceso. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/12/2013 - 03:21 PM |
| 2 y 3 de diciembre de 2013 Entrevistas en medios "Sarakay TV" situación de los casos del consumidor en el mes de diciembre | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/12/2013 - 03:19 PM |
| 28 de junio de 2013 Diario presenta disculpas públicas y promete no volver a repetir los hechos, luego que la Delegación de la Defensoría del Pueblo, notifica providencia de apertura de expediente. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 03:30 PM |
| 29 de octubre de 2013 Participación con Stan informativo "Voces ciudadanas" por invitación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:41 PM |
| Participación de casa abierta con Stan informativo por invitación de la Red de Mujeres por la Vida de Santo Domingo. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:28 PM |
| 26 de agosto de 2013 Visita al Centro de Rehabilitación de Santo Domingo, y participación en conjunto con el Asambleista de Santo Domingo Miguel Angel Moreta en entrevista realizada por PPL en la radio que han creado desde el Centro de Rhabilitación. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:25 PM |
| 26 de setiembre de 2013 Consejo del Gad Municipal, aprueban la donación de terreno para casa defensorial en la provincia | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:21 PM |
| 13 de agosto de 2013 Reunión con Gerenta de EPMAPA para tratar los casos pendientes de solución y que se tramitan en la DPE, revisión de alternativas de solución | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:20 PM |
| 6 de noviembre del 2013 Participación en Desfile cívico y Seción Solemne por sexto año de provincialización de Santo domingo de los Tsáchilas. | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:13 PM |
| 8 de abril de 2013 Visita al centro de Rehabilitación en conjunto con Institución de Derechos Humanos Majama Magandi, por denuncia de restricción a ingreso de alimentación de los PPL | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 02:07 PM |
| 13 de marzo del 2013 Entrevista Radio Festival sobre el Derecho de Acceso a la Información y Casos que se conocen en la Delegación de la Defensoría del Pueblo | Anchundia Ávila, María Alexandra | 15/11/2013 - 12:43 PM |
| 25 de octubre de 2013 Participación en la inauguración de los servicios del centro Judicial de la Concordia y la Posesión de Jueces para la Concordia y Santo Domingo | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/11/2013 - 07:19 PM |
| 29 de octubre de 2013 Participación de Stan informativo denominado "Voces Ciudadanas" por invitación de la Dirección Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control social | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/11/2013 - 07:18 PM |
| 5 de noviembre de 2013 | Anchundia Ávila, María Alexandra | 05/11/2013 - 07:12 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|--|-----------------|-------------------------------|
| Participación en Stan informativo denominando "Feria del Buen Vivir" por invitación de la Gobernación en conmemoración del sexto aniversario de provincialización de Santo Domingo | | |
| En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas fuente: POA aprobado 18/01/2013 | Cachott, Fabián | 06/02/2013 - 10:18 AM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Problema | Fecha de Última Actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | implementación de nuevo sistema (SIGED) estan retardando el despacho de causas | 05/11/2013 | María Alexandra Anchundia Ávila | 70 | 80 | 56 | 0/0 |

Problemas cerrados: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Riesgo | Fecha de Última Actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 1- INTERNO.3. Procesos. La implementación de la nueva estructura orgánica sin el recurso humano y económico CAUSARÍA la lentitud en el despacho de causas | 05/11/2013 | María Alexandra Anchundia Ávila | 70 % | 80 | 56 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 4 - Pacifico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|-----------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | POA Aprobado 18/01/2013 | 0. Anteproyecto | 18/01/2013 | | 18/01/2013 | | Sí | 0.0 |
| 2 | Expedientes - febrero (Informe) | 3. Ejecución | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 3.0 |
| 3 | Movilización audiencias, notificación y revisión de expedientes- febrero (Informe) | 3. Ejecución | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 2.0 |
| 4 | Movilización para entrega entregar notificaciones, audiencias, revisión de expedientes - febrero (Informe) | 3. Ejecución | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 2.0 |
| 5 | Movilización para notificaciones, verificación de lo solicitado e informe -febrero (Informe) | 3. Ejecución | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 3.0 |
| 6 | Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales, ONG , acompañamiento, visita, inspecciones - febrero(Informe) | 3. Ejecución | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 7 | Expedientes - marzo (Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 3.0 |
| 8 | Movilización audiencias, notificación y revisión de expedientes- marzo (Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 3.0 |
| 9 | Movilización para entrega entregar notificaciones, audiencias, revisión de expedientes - marzo (Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 3.0 |
| 10 | Movilización para notificaciones - marzo(Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 3.0 |
| 11 | Movilización para notificaciones, verificación de lo solicitado e informe -marzo (Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 2.0 |
| 12 | Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales, ONG , acompañamiento, visita, inspecciones - marzo (Informe) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 3.0 |
| 13 | Expedientes - abril (Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 3.0 |
| 14 | Movilización audiencias, notificación y revisión de expedientes- abril (Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 3.0 |
| 15 | Movilización para entrega entregar notificaciones, audiencias, revisión de expedientes - abril (Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 2.0 |
| 16 | Movilización para inspecciones - abril(Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 2.0 |
| 17 | Movilización para notificaciones, verificación de lo solicitado e informe -abril (Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 3.0 |
| 18 | Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales, ONG , acompañamiento, visita, inspecciones - abril (Informe) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 3.0 |
| 19 | Expedientes - mayo (Informe) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 2.0 |
| 20 | Movilización audiencias, notificación y revisión de expedientes- mayo (Informe) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 3.0 |
| 21 | Movilización para entrega entregar notificaciones, audiencias, revisión de expedientes - mayo (Informe) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 3.0 |
| 22 | Movilización para notificaciones, verificación de lo solicitado e informe -mayo (Informe) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 3.0 |
| 23 | Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales, ONG , acompañamiento, visita, inspecciones - mayo (Informe) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 3.0 |
| 24 | Expedientes - junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 3.0 |
| 25 | Movilización audiencias, notificación y revisión de expedientes- junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | Movilización para entrega entregar notificaciones, audiencias, revisión de expedientes -v junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 3.0 |
| 27 | Movilización para notificaciones - junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 3.0 |
| 28 | Movilización para notificaciones, verificación de lo solicitado e informe -junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 3.0 |
| 29 | Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales, ONG , acompañamiento, visita, inspecciones -junio (Informe) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 2.0 |
| 30 | Expedientes - julio (Informe) | 3. Ejecución | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 3.0 |
| 31 | Movilización para inspecciones - julio (Informe) | 3. Ejecución | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 2.0 |
| 32 | Expedientes - agosto (Informe) | 3. Ejecución | 31/08/2013 | | 31/08/2013 | | Sí | 3.0 |
| 33 | Expedientes - septiembre (Informe) | 3. Ejecución | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 4.0 |
| 34 | Expedientes - octubre (Informe) | 3. Ejecución | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 4.0 |
| 35 | Expedientes - noviembre (Informe) | 3. Ejecución | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 4.0 |
| 36 | Expedientes - diciembre (Informe) | 3. Ejecución | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 4.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Anticipo Total Entregado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 710.00 ** |
| Costo Total: | 710.00 |
| Total Devengado: | 290.00 |
| % Costo Total Devengado: | 40.85 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 40.85 %

Perfil Económico 2013

| | Años Previos | Año Actual (2013) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|---------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| Planeado - Codificado (2013) | | 0.00 | | |
| Ppto. Programado | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 0.00 % | 40.85 % | 0.00 % | 40.85 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

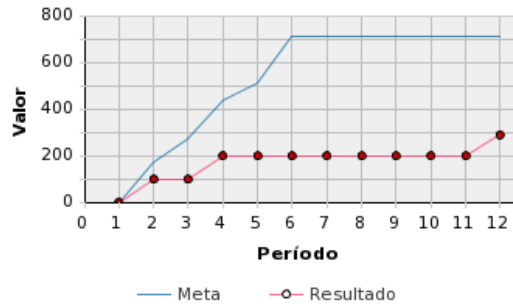

Presupuesto Mensual 2013

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 % | 🔴 | 0.00 % |
| Feb | 110.00 | 100.00 | 170.00 | 100.00 | 58.82 % | 🔴 | 14.08 % |
| Mar | 100.00 | 0.00 | 270.00 | 100.00 | 37.04 % | 🔴 | 14.08 % |
| Abr | 170.00 | 100.00 | 440.00 | 200.00 | 45.45 % | 🔴 | 28.17 % |
| May | 70.00 | 0.00 | 510.00 | 200.00 | 39.22 % | 🔴 | 28.17 % |

| Presupuesto Mensual 2013 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jun | 200.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 200.00 | 28.17 % | | 28.17 % |
| Dic | 0.00 | 90.00 | 710.00 | 290.00 | 40.85 % | | 40.85 % |
| Total | 710.00 | 290.00 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 1 | Incrementar la calidad de las resoluciones MEDIANTE 1.-Creacion de manuales de capacitación; 2.-capacitación de recursos humanos; 3.-incrementar el uso de instrumentos internacionales y jurisprudencia interanacional y gaceta judicial; 4.- incremento de personal; 5.-autocapacitación; |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Archivo | Descripción de Archivo | Fecha de Alta |
|---|---|---|---------------|
| 1 | INFORME UNIFICADO OCTUBRE FINAL.xls | matriz de casos de octubre (hito 34) | 05/11/2013 |
| 2 | CAPACITACIÓN SIGED.doc | ACCION QUE MINIMIZA EL RIESGO QUE AFECTA LA EFICACIA DE LA ACCIONES DEFENSORIALES | 05/01/2014 |
| 3 | CERTIFICADO DE DONACIÓN GAD MUNICIPAL.pdf | JUSTIFICACIÓN DE GESTIONES PARA DONACIÓN DE TERRENO Y MITIGAR EL RIESGO | 05/01/2014 |
| 4 | INFORME UNIFICADO DICIEMBRE FINAL.xls | hito 36 | 05/01/2014 |
| 5 | INFORME UNIFICADO SEPTIEMBRE.xls | hito 33 | 18/11/2013 |
| 6 | INFORME UNIFICADO AGOSTO.xls | hito 32 | 18/11/2013 |
| 7 | INFORME UNIFICADO NOVIEMBRE FINAL.xls | informe de casos noviembre, hito 35 | 05/12/2013 |
