

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes

PROYECTO: **MPTTCD G001** Gestión de Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes.

Líder del Proyecto:	Patiño Carreño, Carla (cpatino@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benalcázar Alarcón, Patricio Vicente	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,830.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Pérez, Nicole	Fecha del siguiente Hito:	

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013

Beneficios Cualitativos

Los beneficios que se desean obtener con el proyecto es mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, evitar la tortura y otros tratos crueles, recomendar a las autoridades a fin de que cumplan con acciones encaminadas a la protección de toda persona privada de la libertad.

Restricciones

COSTO: \$ 10 280,00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO


TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

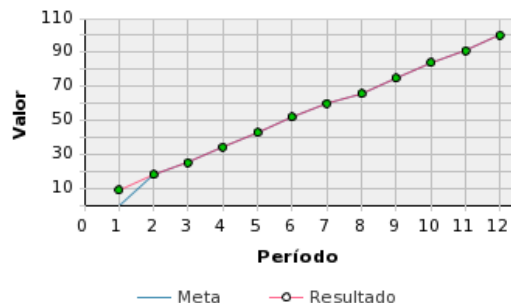

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	9 %	18 %	25 %	34 %	43 %	52 %	60 %	66 %	75 %	84 %	91 %	100 %
	Avance real acumulado											
	9 %	18 %	25 %	34 %	43 %	52 %	60 %	66 %	75 %	84 %	91 %	100 %
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>DICIEMBRE 2013: Durante este mes se realizó la presentación del trabajo del MNPT en el evento realizado "Tiempo de Derechos: Presentación de Productos de las Direcciones de Protección y de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo", realizado el martes 10 de Diciembre de 2013 en el Auditorio Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA.</p> <p>Se cuenta con el informe anual del trabajo realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.</p> <p>Se realizó una visita a una Casa Hogar perteneciente a la Fundación REMAR.</p>	Caicedo Valladares, Susana Del Carmen	23/12/2013 - 09:01 AM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se realizaron 2 visitas a Centros de privación de la Libertad: 1 visita pormenorizada al CRS - Ambato; 1 visita de seguimiento al CRSF Quito - Inca. No hubo inconvenientes para el ingreso de los Centros. Se realizaron 2 informes de las visitas realizadas. Se remitieron recomendaciones a las autoridades competentes del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos mediante el sistema documental Quipux.</p>	Guevara, Vanessa	19/12/2013 - 11:45 AM
<p>OCTUBRE 2013: Se realizaron 2 visitas a Centros de privación de la Libertad: 1 visita pormenorizada al CAIV- Guayaquil; 1 visita de seguimiento al CRS de Santo Domingo de los Tsáchilas. No hubo inconvenientes para el ingreso de los Centros. Se realizaron 2 informes de las visitas realizadas. Se remitieron recomendaciones a las autoridades competentes del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos mediante el sistema documental Quipux. Elaboración del Borrador del Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad: 1 visita pormenorizada al CRS Bahía y 1 visita de seguimiento al CRS - Machala. 2 informes de las visitas elaborados y enviados a las autoridades. 1 informe con conclusiones y recomendaciones elaborado y enviado.</p> <p>AGOSTO 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad: 1 visita pormenorizada al CRS Loja y 1 visita de seguimiento al CAI Femenino Quito-Conocoto. 2 informes de las visitas elaborados y enviados a las autoridades. 1 informe con conclusiones y recomendaciones elaborado y enviado.</p> <p>JULIO 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad: 1 visita pormenorizada al CRS Guaranda y 1 visita de seguimiento al CRS - Sucumbíos. 2 informes de las visitas elaborados y enviados a las autoridades. 1 informes con conclusiones y recomendaciones elaborado y enviado.</p> <p>JUNIO 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad: 1CRSV -CUENCA y 1 CAI - RIOBAMBA . 2 Informes ejecutivos de las visitas elaborados: 1CRS y 1 CAI . 1 Visita de seguimiento realizada al CRSF - CUENCA 1Informe ejecutivo de la visita de seguimiento al CRSF - CUENCA elaborado.</p>	Caicedo Valladares, Susana Del Carmen	08/10/2013 - 10:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>MAYO 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad: 1CRSV- Machala y 1 CRS - Sucumbíos . 2 Informes ejecutivos de las visitas elaborados: 1CRS Rodeo y 1 CRS -Cañar . 1 Visita de seguimiento realizada al CRSV - Esmeraldas 1Informe ejecutivo de la visita de seguimiento al CRSV - Esmeraldas elaborado.</p> <p>ABRIL 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad, 1CRS Rodeo y 1 CRS -Cañar . 2 Informes ejecutivos de las visitas elaborados: 1CRS Rodeo y 1 CRS -Cañar . 1 Seminario Internacional realizado para promocionar la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.</p> <p>MARZO 2013: 2 Visitas realizadas a los Centros de Privación de la Libertad, 1 CAI Esmeraldas y 1 CRS - Loja . 2 Informes ejecutivos de las visitas elaborados: CAI - Esmeraldas y CRS - Loja.</p> <p>FEBRERO 2013: 2 Visitas a los Centros de Rehabilitación de las ciudades de TENA e IBARRA realizados. 2 Informes de visitas elaborados sobre condiciones del CRS TENA E IBARRA</p> <p>ENERO 2013: 1 Visita realizada al Centro de Rehabilitación Femenino de la ciudad de Cuenca. 1 Informe de visita elaborado sobre condiciones del CRSF - Cuenca</p>		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	2.0
2	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. ENERO(Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		22/01/2013		Sí	3.0
3	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. ENERO (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
4	Realización de acciones de prevención - Planificación de 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional ENERO (Agenda)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
5	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. FEBRERO(Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	recomendaciones.FEBRERO (Informe)							
7	Realización de acciones de prevención - Establecer lineamientos para a imagen del concepto comunicacional y material prom MNP (LOGOTIPO-INFORME)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
8	Realización de acciones de prevención - Planificación de 2 visitas mensuales a los CPL a nivel naciona IFEBRERO (Agenda)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
9	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad.MARZO (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
10	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones.MARZO (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
11	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional MARZO (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
12	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. .ABRIL (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		24/04/2013		Sí	2.0
13	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones.ABRIL (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
14	Realización de acciones de prevención - Intercambio de Experiencias Internacionales con otros Mecanismos de Prevención de la Tortura (INFORME)	3. Ejecución	30/04/2013		25/04/2013		Sí	2.0
15	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional .ABRIL (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
16	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad.MAYO (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
17	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones.MAYO (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional MAYO (informe)	-- Otros	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
19	Realización de acciones de prevención - Realización de visitas de seguimiento a las recomendaciones realizadas MAYO (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
20	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. JUNIO (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
21	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. JUNIO (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
22	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional JUNIO (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
23	Realización de acciones de prevención - Realización de visitas de seguimiento a las recomendaciones realizadas JUNIO (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
24	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. JULIO (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
25	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. JULIO (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
26	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional JULIO (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
27	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. AGOSTO (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
28	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. AGOSTO (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
29	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional AGOSTO (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
30	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. SEPTIEMBRE (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
31	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. SEPTIEMBRE (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
32	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional SEPTIEMBRE (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
33	Realización de acciones de prevención - Realización de visitas de seguimiento a las recomendaciones realizadas - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
34	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. OCTUBRE (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
35	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. OCTUBRE (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	3.0
36	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional OCTUBRE (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	3.0
37	Realización de acciones de prevención - Realización de visitas de seguimiento a las recomendaciones realizadas - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
38	Realización de acciones de prevención - 2 visitas mensuales a centros de privación de libertad. NOVIEMBRE (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
39	Realización de acciones de prevención - Elaboración de informes de cada visita con conclusiones y recomendaciones. NOVIEMBRE (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	3.0
40	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional NOVIEMBRE (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
41	Realización de acciones de prevención de situaciones de tortura y malos tratos en los centros de privación de libertad- Sistematización del	3. Ejecución	31/12/2013		23/12/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	lanzamiento del informe del MNPT -Diciembre (informe)							
42	Realización de acciones de prevención - Elaboración y Publicación del Informe Anual del Mecanismo (PUBLICACIÓN)	3. Ejecución	31/12/2013		23/12/2013		Sí	3.0
43	Realización de acciones de prevención - Planificación de al menos 2 visitas mensuales a los CPL a nivel nacional DICIEMBRE (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		23/12/2013		Sí	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de centros de privación de la libertad visitados		50.00 %	2	1	01/01/2013	Diciembre
2	Número de informes presentados posterior a las visitas realizadas		50.00 %	2	1	01/01/2013	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,830.00 **
Costo Total:	20,830.00
Total Devengado:	17,079.73
% Costo Total Devengado:	82.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 82.00 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00
Ppto. Codificado	0.00	20,830.00	0.00	20,830.00
Planeado - Codificado (2013)		-20,830.00		
Ppto. Programado	0.00	20,830.00	0.00	20,830.00
Ppto. Devengado	0.00	17,079.73	0.00	17,079.73
Estimado a fin de año	* 0.00	20,830.00	0.00	20,830.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	82.00 %	0.00 %	82.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

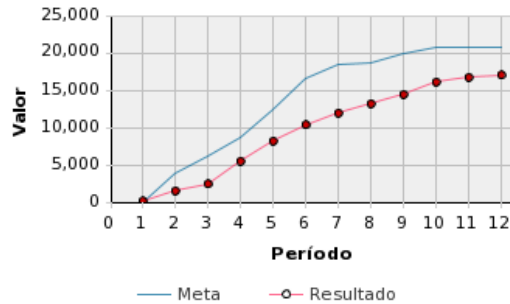

Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,400.00	160.00	1,400.00	160.00	11.43 %	🔴	0.77 %
Feb	2,400.00	1,328.98	3,800.00	1,488.98	39.18 %	🔴	7.15 %
Mar	2,400.00	980.00	6,200.00	2,468.98	39.82 %	🔴	11.85 %
Abr	2,400.00	3,049.76	8,600.00	5,518.74	64.17 %	🔴	26.49 %
May	3,720.00	2,646.16	12,320.00	8,164.90	66.27 %	🔴	39.20 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	4,160.00	2,212.53	16,480.00	10,377.43	62.97 %		49.82 %
Jul	1,875.00	1,558.63	18,355.00	11,936.06	65.03 %		57.30 %
Ago	325.00	1,253.64	18,680.00	13,189.70	70.61 %		63.32 %
Sep	1,200.00	1,192.35	19,880.00	14,382.05	72.34 %		69.04 %
Oct	950.00	1,662.83	20,830.00	16,044.88	77.03 %		77.03 %
Nov	0.00	673.10	20,830.00	16,717.98	80.26 %		80.26 %
Dic	0.00	361.75	20,830.00	17,079.73	82.00 %		82.00 %
Total	20,830.00	17,079.73					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	AGENDA DE VISITACRSV-CUENCA.doc	HITO 22 AGENDA CRSV CUENCA	04/07/2013
2	AGENDA DE VISITACAI RIOBAMBAJUNIO2013.doc	HITO 22 AGENDA CAI RIOBAMBA	04/07/2013
3	AGENDA DE VISITACRS SUCUMBOS.doc	Hito 26 Agenda - CRS - Sucumbíos	31/07/2013
4	INFORME EJECUTIVO CRS-CAÑAR2013.doc	INFORME CRS CANTÓN CAÑAR	03/05/2013
5	INFORME DE SEGUIMIENTO CRSV CUENCA-JUNIO2013.doc	HITO 23 Seguimiento CRSF - CUENCA	04/07/2013
6	INFORME EJECUTIVO VIAJE MANTA RODEO2013.doc	INFORME EJECUTIVO CRS RODEO	03/05/2013
7	INFORME DE SEGUIMIENTO CRS SUCUMBÍOS-JULIO2013 (Reparado).doc	Hito 24 Informe de visita de seguimiento al CRS - Sucumbíos	31/07/2013
8	AGENDA DE VISITACRS-BOLIVAR.doc	Hito 26 Agenda - CRS - Guaranda	31/07/2013
9	INFORME CRS-BOLIVARJULIO-2013.doc	Hito 24 Informe CRS - Guaranda - Bolívar	31/07/2013
10	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CRS-BAHIA-2013.doc	HITO 31 INFORME RECOMENDACIONES CRS - BAHIA	02/10/2013
11	AGENDA DE VISITACRS-BAHIA - MAMABÍ SEPTIEMBRE-2013.doc	HITO 32 AGENDA DE TRABAJO CRS - BAHIA	02/10/2013
12	AGENDA DE VISITACRS MACHALA SEPTIEMBRE 2013.doc	HITO 32 AGENDA VISITA CRS - MACHALA	02/10/2013
13	INFORME DE SEGUIMIENTO CRS-MACHALA-SEPTIEMBRE 2013 corregido.doc	HITO 33 INFORME DE SEGUIMIENTO CRS - MACHALA	02/10/2013
14	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CRS-BOLÍVAR-2013.doc	Hito 25 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CRS - GUARANDA	01/08/2013
15	INFORME CRS-BAHIASEPTIEMBRE2013.doc	HITO 30 VISITA PORMENORIZADA CRS - BAHÍA	02/10/2013
16	INFORME CRSVCUENCAJUNIO-2013.doc	HITO 20 - CRSV CUENCA	04/07/2013
17	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CRSV-CUENCA-2013.doc	HITO 21CRSV - CUENCA	04/07/2013
18	INFORME CAI-RIOBAMBAJUNIO-2013.doc	HITO 20 CAI RIOBAMBA	04/07/2013
19	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CAI-RIOBAMBA-2013.doc	HITO 21 CAI RIOBAMBA	04/07/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
20	PRESENTACIÓN MNPT DICIEMBRE 2013.ppt	Hito 41 Presentación para Evento.	23/12/2013
21	Agenda Tiempo de derechos.doc	Hito 41 Agenda	23/12/2013
22	INFORME ANUAL MNPT Versión final 16-12-2013 lu.pdf	Hito 42 Informe Final 2013	23/12/2013
23	Informe visita Fundación Remar.doc	Hito 43 Informe Visita Casa Hogar Remar	23/12/2013
24	INFORME EJECUTIVO VIAJE TENA2013.doc	INFORME EJECUTIVO TENA	04/04/2013
25	AGENDA DE VISITACAI CONOCOTO AGOSTO2013.doc	HITO 29	04/09/2013
26	AGENDA DE VISITA SEGUIMIENTO CRS LOJAAGOSTO2013.doc	HITO 29	04/09/2013
27	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CAI-CONOCOTO.doc	HITO 28	04/09/2013
28	INFORME DE SEGUIMIENTO CRS-LOJA-AGOSTO 2013.doc	HITO 27	04/09/2013
29	INFORME CAI CONOCOTO.doc	HITO 27	04/09/2013
30	INFORME DEL TALLER DEL 25 Y 26 DE ABRILMECANISMO.doc	INFORME TALLER MECANISMO ABRIL 2013	03/05/2013
31	INFORME EJECUTIVO CRS-MACHALA2013ULTIMO.doc	HITO 16	05/06/2013
32	AGENDA DE VISITACRS MACHALA.doc	HITO 18	05/06/2013
33	RECOMENDACIONES CRS-MACHALA2013.doc	HITO 17	05/06/2013
34	AGENDA DE VISITACRS SUCUMBIOS.doc	HITO 18	05/06/2013
35	INFORME CRS-SUCUMBIOSMAYO2013.doc	HITO 16	05/06/2013
36	RECOMENDACIONES CRS-SUCUMBIOS-2013.doc	HITO 17	05/06/2013
37	INFORME DE SEGUIMIENTO CRS-SANTO DOMINGO-OCTUBRE 2013 .doc	Hito 37 Informe de seguimiento CRS Santo Domingo de los Tsáchilas	31/10/2013
38	AGENDA DE VISITACRS-SANTO DOMINGO-OCTUBRE-2013.doc	Hito 36 Agenda CRS Santo Domingo de los Tsáchilas	31/10/2013
39	AGENDA DE VISITACAI V GUAYAQUIL-OCTUBRE-2013.doc	Hito 36 Agenda CAIV Guayaquil	31/10/2013
40	AGENDA DE VISITACRS - LOJAMIXTO.doc	AGENDA VISITA CRS MIXTO LOJA	05/04/2013
41	AGENDA DE VISITACRS MIXTOIBARRA.doc	AGENDA VISITA CRS MIXTO IBARRA	05/04/2013
42	INFORME VISITACRS AMBATONOVEMBRE2013.doc.tar.gz	Hito 38 Informe CRS Ambato Noviembre 2013	02/12/2013
43	INFORME DE SEGUIMIENTO CRSFINCA-NOVIEMBRE2013 .doc	Hito 38 Informe CRSFQuito - Inca	02/12/2013
44	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CRS-AMBATO-2013.doc	Hito 39 Conclusiones y Recomendaciones CRS Ambato	02/12/2013
45	AGENDA DE VISITACAI ESMERALDASHOMBRES.doc	HITO 18	05/04/2013
46	AGENDA DE VISITACRSFTENA.doc	AGENDA VISITA CRS MIXTO TENA	05/04/2013
47	Informe visitaCRSMUJERES- CUENCA.doc	HITO 2	05/04/2013
48	AGENDA DE VISITACRSFCUENCA.doc	HITO 4	05/04/2013
49	AGENDA DE VISITACRS MIXTO AMBATO--2013.doc	Hito 40 Agenda CRS Ambato	02/12/2013
50	AGENDA DE VISITACRSF QUITO-INCA--2013.doc	Hito 40 Agenda CRSQ - Inca	02/12/2013
51	INFORME CAIV GUAYAQUIL.doc	Hito 34 Informe CAI Varones Guayaquil	31/10/2013
52	INFORME EJECUTIVO VIAJE LOJA2013.doc	INFORME EJECUTIVO LOJA	05/04/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
53	CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES CAI-GUAYAQUILFINAL .doc	Hito 35 Conclusiones y recomendaciones CAIV Guayaquil	31/10/2013
54	INFORME EJECUTIVO CAI ESMERALDAS-2013.doc	INFORME EJECUTIVO CAI ESMERALDAS	05/04/2013
55	INFORME EJECUTIVO VIAJE IBARRA2013.doc	INFORME EJECUTIVO IBARRA	05/04/2013
56	Hito 2 Visitas CRSFCUE_ene2013.doc	Hito 2	05/02/2013
