

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 2

PROYECTO: CR2 G011 Gestión Comisión Regional 2

Líder del Proyecto:	Banchon Vasquez, Norma Alexandra (abanchon@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Ramirez Durini, Antonio Alvaro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.01 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,212.20
Localidad de Gestión :	Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: \$ 15.410.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Galápagos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

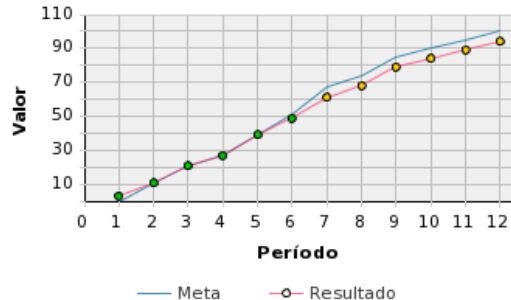

Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	3 %	11 %	21 %	27 %	39 %	51 %	67 %	74 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3 %	11 %	21 %	27 %	39 %	49 %	61 %	68 %	79 %	84 %	89 %	94 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Diciembre 2013: Durante este mes se ejecutaron actividades de sensibilización por la Semana tiempo de Derechos, para ello se ejecutaron en cada una de las Delegaciones provinciales el vídeo Foro sobre desaparecidos esta actividad tuvo como objetivo la sensibilización a servidores públicos y ciudadanos acerca de esta problemática de igual manera se busco establecer compromisos de parte de las instituciones encargadas de este tema a nivel local. En las cinco provincias se alcanzo la participación de aproximadamente 500 personas, siendo mayor la participación en Guayaquil y Santa Elena. También se llevan a cabo en Guayaquil la Marcha por el Día de los DDHH misma que se organizo con el CDH en esta actividad participan cerca de 200 personas. En Santa Elena se lleva a cabo el Encuentro de Defensores de los Derechos Humanos actividad en la que participan defensores comunitarios de 12 comunas y 47 alumnos defensores de los DDHH formados en el proyecto UPSE-DPE, en esta actividad participan 304 personas. En este mes también se ejecutan actividades de promoción de DDHH en cinco de los seis centros educativos que formaron parte del proceso de formación a maestros realizándose diversas actividades al interior de los Centros Educativos como casas abiertas, marchas, obras de teatro alusivas a la defensa de DDHH. En este mes se participa de actividades por de el día internacional contra la corrupción actividad que se coordina con las instituciones que forman parte del Consejo de transparencia. Durante este mes se realizan visitas a las provincias de Santa Elena y Los Ríos a fin de apoyar a la ejecución de actividades de promoción y se cierra y clausura el proyecto de formación de lideres defensores de los Derechos humanos entregándose 47 diplomas de finalización del proyecto a alumnos, facilitadores y capacitadores.</p>	Chumo, Sandra	03/01/2014 - 04:52 PM
<p>Noviembre 2013: Durante este mes se da continuidad al convenio entre la UPSE y la DPE el mismo que se encuentra en la fase de ejecución de proyectos sociales para culminar con el cierre del proceso en el mes de diciembre. En este mes se ejecuta el módulo de prevención de la discriminación en centros educativos, con el cual se cierra el proceso de capacitación a maestros de seis instituciones educativas. En este mes se realiza el encuentro regional con la participación de los delegados de las cinco provincias de la región entre los puntos tratados en la agenda fueron las experiencias exitosas en materia de promoción y prevención. De igual manera la CR2 participa del encuentro nacional a fin de socializar y revisar la articulación de temas de promoción y tutelares. En temas de incidencia se toma contacto con la prefectura a fin de revisar elementos para la consideración de procesos de promoción en DDHH. Con la sociedad civil se retoma reuniones con los Adultos Mayores a fin de revisar los avances y establecer compromisos para la incidencia de la ley del ciclo de vida en el 2014, se mantienen los contactos con CDH con quienes se efectúan varias reuniones a fin de planificar un conjunto de actividades de la semana de derechos en el mes de diciembre. En temas de acompañamiento técnico se logran visitar las provincias de Los Rios, Santa Elena, El Oro, y se mantienen vídeo conferencias con Galápagos y reuniones de coordinación en temas de promoción e incidencia con Guayas.</p>	Rovira Jurado, Zaida Elizabeth	18/12/2013 - 02:07 PM
<p>Octubre 2013: Durante este mes se llevan a cabo los eventos de promoción en el tema de Transparencia y Acceso a la información Pública, es así que se realiza el FERIA CIUDADANA "ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ES UN HECHO ES TU DERECHO" que contó con la participación de alrededor de 1000 personas entre alumnos asistentes de los centros educativos invitados, ciudadanía en general y servidores públicos de instituciones invitadas, para la ejecución de esta actividad se coordinaron acciones con las Instituciones que forman parte de la función de transparencia y control social entre ellas la Contraloría, La Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Telecomunicaciones, Concejo de Participación, Asociación de Municipalidades, Ministerio de Educación, etc. De igual manera se realiza la retransmisión de Conferencia Internación Por semana de la Transparencia actividad a la asisten representantes servidores públicos de seis instituciones. En temas de promoción y capacitación en DDHH se da continuidad al proceso de formación a Maestros de seis instituciones educativas, el taller dictado se denominó "Educación en DDHH", se coordina con la Delegación Guayas la presentación del manual de atención a Personas viviendo con VIH presentado por el CDH y ONU sida, este evento fue dirigido a servidores públicos de atención de instituciones que se relacionan a la atención de este colectivo. En temas de incidencia se mantienen los espacios de articulación con las Defensorías Comunitarias de Santa Elena y los Gobiernos Parroquiales.</p>	Chumo, Sandra	12/12/2013 - 03:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Respecto del acompañamiento a las Delegaciones Provinciales se visitan las provincias de Santa Elena y Los Rios. Durante este periodo se realizan cambios de autoridades de la CR2 asumiendo la titularidad la Ab. Alexandra Banchón a partir del 21 de octubre del 2013.		
Septiembre 2013: Durante este mes se mantienen los espacios de coordinación con el Concejo de Participación Ciudadana en temas relacionados a las Defensorías Comunitarias y La Ley de los Concejos de Igualdad; Con la Super intendencia de Telecomunicaciones, Super intendencia de compañías y Contraloría se mantienen espacios de coordinación de acciones de promoción e incidencia de la LOTAIP. Con la ONG de la sociedad civil se mantienen espacios de coordinación con 9 Defensorías Comunitarias de Santa Elena a quienes se capacita en temas relacionados a las competencias de la DPE y derivación de casuística. En temas de promoción y capacitación se da continuidad al proceso de Sensibilización y Capacitación a maestros en DDHH y Prevención de la discriminación en centros educativos, para ello se ejecuta el segundo módulo de formación denominado "DDHH en la Constitución Ecuatoriana y otros instrumentos internacionales" con la participación de 36 maestros; Como respuesta al pedido de la policía de Migración se realiza el taller de Sensibilización en Movilidad Humana mismo que fue dirigido a 21 policías de migración. En Santa Elena se da continuidad al proyecto de "Formación de colectivo de Jóvenes Defensores de los DDHH y de la Naturaleza de Santa Elena con ellos se ejecuta el módulo de "Revisión y Ejecución de Proyectos Sociales en DDHH". En la región se da seguimiento a las provincias de Santa Elena y Los Rios estableciéndose acuerdos y compromisos de trabajo acordes al acompañamiento realizado desde la CR2. Dado el encargo de la Comisión Regional 2 y de la Delegación de Santa Elena se informa que el equipo de la CR2 viene dando apoyo directo a la Delegación de Santa Elena en temas administrativos, de planificación y de revisión de expedientes para lo cual se solicito a la Secretaria General la auditoría de expedientes actividad que se la realizo con el equipo de la Delegacion de Santa Elena y el equipo de la CR2.	Chumo, Sandra	06/11/2013 - 08:32 AM
Agosto 2013: Durante este mes se produce el cambio de Comisionado Regional, quedando como autoridad la Ab. Zaida Rovira. Las actividades ejecutadas desde esta comisión se resumen en procesos sostenidos de capacitación y apoyo a grupos de atención prioritaria organizados entre ellos los grupos LGBTI, Defensorías Comunitarias de Santa Elena y Adultos Mayores con quienes se llevan a cabo los talleres de "Revisión de la Técnica jurídica del Anteproyecto del Adulto Mayor, y El proceso de sensibilización y capacitación a maestros en DDHH y prevención de la discriminación en Centros educativos, el producto de estos dos eventos es 65 personas capacitadas. En este periodo se realizan visitas de acompañamiento a las Delegaciones de Santa Elena y Galápagos, especialmente en esta última se recogen insumo para el levantamiento del diagnóstico social proceso que culmina con la entrega del informe en el mes de noviembre del 2013. Se da continuidad al proyecto de Formación de Colectivo de Jóvenes defensores de los DDHH y de la naturaleza de la provincia de Santa Elena para lo cual se ejecuta el modulo de presentación y revisión de proyectos para lo cual se definen tres proyectos para su ejecución en comunidad.	Chumo, Sandra	04/10/2013 - 03:37 PM
Julio 2013: Se ejecuta el Encuentro Regional con la participación de las Delegaciones de Santa Elena, Los Rios, El Oro, Guayas y Galápagos previo al encuentro el equipo de esta Comisión realiza visitas a cada una de las Delegaciones con la finalidad de trabajar con los equipos técnicos el diagnósticos de cada una de las oficinas y las proyecciones para el siguiente cuatrimestre mediante la herramienta FODA, el encuentro tuvo como producto la revisión de estrategias para el fortalecimiento de las Delegaciones y la articulación con la CR2, se dan lineamientos para el diagnóstico social, así como herramientas para los temas de promoción. Durante este mes se mantienen acciones de coordinación interinstitucional con el Concejo de Participación ciudadana a fin de revisar el proyecto de fortalecimiento a las Defensorías Comunitarias, proceso que requiere ser revisado detalladamente dada las competencias que se les esta asignando a las DC. SE mantienen espacios de coordinación con grupos de la sociedad civil entre ellos la red de Adultos Mayores Redpermaque con quienes se lleva a cabo un taller "Metodología e Instrumentos en la Incidencia sobre Políticas Públicas con Adultos Mayores" con la participación de 60 miembros de 7 comités de Adultos Mayores de Guayaquil. Se mantienen espacios de articulación y coordinación con el Grupo LGBTI, Defensorías Comunitarias, Asociación Formate Ecuador y Observatorio Ciudadano para Probidad y transparencia OPTA-Justicia. Se mantiene la ejecución del Convenio con la UPSE dictándose dos talleres relacionados al tema de proyectos sociales en Derechos Humanos con la participación de los alumnos que se encuentran vinculados a este proyecto. Se participa de la reunión de revisión y ejecución del GPR y POA, desde las Delegaciones de Los Rios y El Oro se participa en el Seminario Internacional para la utilización racional del MANCOCEB en la agricultura, desde la Delación de Guayas se participa en la reunión de seguimiento de los procesos del proyecto con el Acnur. En temas de LOTAIP se reciben cinco informes los mismos que se remiten a la Dirección de Promoción. Respecto de los Hito 26 y 29 que corresponde al "Proyecto de Investigación sobre la temática de discriminación en centros educativos" y el "Proyecto Fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la Naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena" respectivamente se indica que estos no cuenta con presupuesto asignado dentro	Chumo, Sandra	05/09/2013 - 01:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>del POA de la CR2, razón por la cual no se encuentra ejecutándose desde esta Comisión, por esta razón los Hitos 26 y 29 aparece como no cumplidos.</p>		
<p>Junio 13: Durante este mes se ejecuto con éxito las diversas acciones planificadas desde la CR2, entre ellas la Vigilia Marítima por el derecho a una vida libre de violencia y discriminación" actividad ejecutada en la provincia de Santa Elena. Se ejecuto el módulos de capacitación " Garantías Constitucionales" con los 60 alumnos del convenio con la UPSE, los alumnos realizan trabajo de campo al trabajar con los pescadores en temas de sensibilización adornando las embarcaciones para el evento de Santa Elena con temas alusivos a los DDHH en contra de la violencia y discriminación. Se realiza el FODA de la región elaborando las proyecciones y estrategias para la Cr2. Se lleva a cabo el taller de Admisibilidad dirigido a los equipos de abogados de reciente ingreso de las Delegaciones provinciales de esta regional, Se lleva a cabo las visitas de acompañamiento técnico y monitoreo a la oficina del cantón Durán. Se realizan acciones de incidencia con instituciones públicas tales como el Concejo de Participación ciudadana, ministerios de la provincia de Santa Elena, Concejo Cantonal de la NNA del Empalme, Jefatura Provincial de Migración. Con instituciones y ONGs privadas se coordinan diversas acciones de promoción e incidencia entre ellas Defensorías Comunitarias, Colectivos GLBTI Silueta X, Asociación de Pescadores de Santa Rosa y Comité Cívico, Red de trabajadoras sexuales del Ecuador, Cepam para la ejecución del evento "Salón de la Comunicación". El comisionado participa de los eventos de capacitación convocados desde la oficina matriz entre ellos: Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos y Taller sobre la Ley de Transparencia.Cabe indicar que el Hito 22 que corresponde al "Proyecto Fortalecimiento de las Defensorias Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la Naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena" no cuenta con presupuesto asignado dentro del POA de la CR2, razón por la cual no se encuentra ejecutándose desde esta Comisión, por esta razón el Hito aparece como no cumplido.</p>	Chumo, Sandra	05/08/2013 - 03:20 PM
<p>Mayo 2013: Durante este mes se da continuidad a las acciones de promoción e incidencia especialmente con los grupos de Adultos Mayores con los cuales se ejecuta el Taller de Socialización y Revisión del Anteproyecto de Ley de Protección y atención prioritaria de las personas Adultas Mayores de Ecuador, con la participación de 9 instituciones públicas y 14 organizaciones privadas y/o colectivos de AM.Se da continuidad a las actividades de acompañamiento técnico y monitoreo a las Delegaciones de Santa Elena y El Oro, además se visitan los cantones de Milagro y Daule. Se retoma la segunda fase de ejecución del proyecto de Formación de Colectivo de Jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la Naturaleza para lo cual se realiza un taller de planificación para la revisión del cronograma de talleres a ejecutarse con los alumnos inscritos en el proyecto.Durante este mes se lleva a cabo el cambio de las oficinas y la inauguración del edificio evento que contó con la participación del Defensor del Pueblo y autoridades nacionales y locales así como representantes de asociaciones y grupos de la sociedad civil vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.</p>	Chumo, Sandra	05/06/2013 - 04:26 PM
<p>Abril 2013:Durante este mes se ejecuta la planificación de la CR2 en donde se da continuidad a las visitas de monitoreo a las Delegaciones de Santa Elena, El Oro, Los Rios, Guayas (cantones Durán).Se mantiene reuniones de incidencia y coordinación interinstitucional con el IESS en Machala, y la UPSE en Santa Elena, Con ONG de la sociedad civil entre ellos los grupos LGBTI, Plan Internacional, Defensorias Comunitarias y Adultos Mayores se llevan a cabo reuniones de coordinación.En temas relacionados a la coordinación con la Dirección Nacional Tutelar, se lleva a cabo el evento Taller de Lineamiento para el consolidado de la matriz mensual de casos realizado en la ciudad de Guayaquil con la participación de los Delegados y funcionarios de las provincias de Santa Elena, El Oro, Los Rios, Guayas y Galápagos en la que se establecieron acuerdos y compromisos en temas de protección, se recibe la visita de monitoreo de la CR2 y se lleva a cabo una reunión de trabajo con el Adjunto Primero, sus asesores y la Directora de Promoción a fin de revisar los avances y dificultades, estableciendo acuerdos y recomendaciones importantes para esta Comisión.</p>	Chumo, Sandra	29/04/2013 - 04:49 PM
<p>Marzo 2013: Durante este mes se mantienen las acciones para dar seguimiento a la entrega de informes de Lotaip, de igual manera para garantizar el cumplimiento por parte de las instituciones públicas se realizan 4 talleres de capacitación con la participación de 220 personas que corresponden a 69 instituciones públicas de las provincias de Santa Elena, El Oro y Los Rios. Respecto del cumplimiento de la entrega de informes de LOTAIP la region tiene un cumplimiento del 63,16 % a nivel regional. En los temas de promoción de DDHH y prevención de la discriminación se realizan talleres de capacitación y de diagnóstico situacional con organizaciones, fundaciones y asociaciones de la comunidad LGBTI, Adultos Mayores, Personas Viviendo con VIH, Asociaciones de Mujeres. En temas de Incidencia se mantienen reuniones de trabajo con grupos LGBTI, Adultos Mayores etc. En temas de monitoreo a las delegaciones provinciales se realizan acciones de coordinación con la Dirección de protección y con la Delegación de Guayas.</p>	Chumo, Sandra	05/04/2013 - 02:07 PM
<p>Febrero 2013: Durante este mes se realizan procesos de sensibilización y capacitación en los temas de LOTAIP a 180 servidores de 79 instituciones públicas. Se da continuidad a los</p>	Chumo, Sandra	04/04/2013 - 04:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
procesos de incidencia en política pública en el tema de Adultos Mayores. Se ejecuta el primer encuentro regional con las Delegaciones provinciales de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Rios y Galápagos. Y se da acompañamiento y apoyo técnico y monitoreo a las Delegaciones de Santa Elena.		
Enero 2013: durante este mes se participa en actividades con la dirección de promoción y de protección para la revisión de directrices metodológicas y de planificación para las comisiones regionales y las delegaciones provinciales. Coordinación de actividades de incidencia en el tema de Adultos mayores con la participación del grupo ADA (Adultos mayores en acción) y Redpermague para la revisión y planificación de acciones que tiene como objetivo la revisión de la ley de AM y la generación de propuestas. Participación en jornadas de trabajo con la dirección de Promoción y coordinación de transparencia a efectos de construir las rutas para la entrega de informes de LOTAIP. Coordinación de acciones de promoción y protección con las Delegaciones de Guayas y Los Rios. Participación en jornadas para la revisión de presupuestos de la CR2, se aprueba la programación operativa anual de la Comisión Regional 2. fuente: POA aprobado 18/01/2013	Chumo, Sandra	14/02/2013 - 10:58 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.2. Personal. Cambio de autoridades CAUSARIA alteración en la ejecución de actividades de la CR2	02/01/2014	Norma Alexandra Banchon Vasquez	80 %	30	24	2/2

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
5	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balzar
6	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
7	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
8	Zona 5 - Litoral > Guayas > Durán
9	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
10	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
11	Zona 5 - Litoral > Guayas > Gral. Antonio Elizalde (Bucay)
12	Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > Isidro Ayora
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > La Libertad
15	Zona 5 - Litoral > Guayas > Lomas de Sargentillo
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
19	Zona 5 - Litoral > Guayas > Nobol
20	Zona 5 - Litoral > Guayas > Palestina
21	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
22	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salinas
23	Zona 5 - Litoral > Guayas > Samborondon

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
24	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Elena
25	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía
26	Zona 5 - Litoral > Guayas > Simón Bolívar
27	Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi
28	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
29	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
30	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	3.0
2	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - febrero (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
3	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Realización de Encuentros Zonales de planificación - febrero (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
4	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - febrero (informes, actas)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
5	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento para la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - talleres de capacitación, Recepción de informes y remisión de informes -febrero (actas y/o listado de asistencia y/o informes)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - marzo (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
7	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provincias y cantones - marzo (actas, listado de asistencia, informes)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
8	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - marzo (actas, informes, listas)							
9	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-marzo (informe, listado de asistencia).	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
10	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento para la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - talleres de capacitación, Recepción de informes y remisión de informes -marzo (informes y/o actas y/o listado de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
11	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - abril (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
12	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provincias y cantones - abril (actas, informe, listado)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
13	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - abril (actas, informes)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
14	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - mayo (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
15	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza - mayo (listados de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
16	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provincias	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y cantones - mayo (actas de acuerdos, informe de avances)							
17	Gestión de procesos tutelares - mayo (actas, informes)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
18	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - mayo (acta de acuerdos, informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
19	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria- mayo (listado de asistencia, propuesta técnica, informe).	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
20	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - junio (acta de acuerdos y compromisos y/ o listados de asistencia)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
21	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
22	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Fortalecimiento de Defensorías Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena- junio (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
23	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provincias y cantones - junio (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
24	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - junio (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
25	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Ejecución de festival por los DDHH, Foro, y otros espacios masivos de promoción en DDHH y de la naturaleza-junio(listados, informe, propuesta)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto de Investigación sobre la temática de discriminación en centros educativos-julio (actas de acuerdos, informe)	3. Ejecución	30/07/2013	30/07/2013			No	2.0
27	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - julio (actas compromisos)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
28	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza - julio (listado de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
29	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Fortalecimiento de Defensorías Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena-julio(asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
30	Gestión de procesos tutelares - julio (actas de acuerdos)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
31	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Realización de Encuentros Zonales de planificación, monitoreo y evaluación-julio (acta acuerdos, informe, listado de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
32	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - julio (actas, informes)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
33	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-julio (actas).	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
34	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo local (Ordenanzas GAD)- Visita a GAD de las provincias y cantones para retomar acciones de coordinación interinstitucional y procesos de incidencia en política pública-agosto (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/08/2013		30/08/2013		Sí	2.0
35	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza agosto (Informe)							
36	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - agosto (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
37	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-agosto (listados de asistencia, propuesta técnica, informes).	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
38	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
39	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - agosto (acta de acuerdos y compromisos)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
40	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - septiembre (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
41	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - septiembre (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
42	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promover programas de formación en ddhh, con perspectiva de género, étnica e intercultural, a funcionarios públicos-septiembre(asistencia, propuesta)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
43	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza- Capacitación en derechos humanos y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria. septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
44	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y de la naturaleza- Implementar procesos de capacitación- septiembre (asistencia, propuesta técnica)							
45	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local - Ejecución de acciones para coordinar actividades de promoción y protección de DDHH y de la naturaleza y otras acciones relacionadas con el quehacer de la DPE - octubre(actas)	3. Ejecución	30/10/2013		30/10/2013		Sí	1.0
46	Ejecución de acciones de fortalecimiento a grupos organizados de la sociedad civil para la incidencia en política con enfoque de derechos humanos- octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
47	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela- octubre (actas de acuerdos)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
48	Ejecución de actividades de promoción "Semana de Transparencia"- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
49	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - octubre (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
50	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
51	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - noviembre (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
52	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Realización de Encuentros Zonales de planificación, monitoreo y evaluación-noviembre (acta acuerdos, informe, listado de asistencia)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
53	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - noviembre (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza- Capacitación en derechos humanos y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria. septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
55	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes líderes defensores de los DDHH y de la naturaleza diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
56	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - diciembre (actas, informes)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
57	Ejecución de proyectos de arraste e investigación zonal Diciembre(Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
58	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Ejecución de festival por los DDHH, Foro, y otros espacios masivos de promoción en DDHH y de la naturaleza-(listados, informe, propuesta)diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,212.20 **
Costo Total:	27,212.20
Total Devengado:	24,367.62
% Costo Total Devengado:	89.55 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 89.55 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00
Ppto. Codificado	0.00	27,212.20	0.00	27,212.20
Planeado - Codificado (2013)		-9,502.20		
Ppto. Programado	0.00	27,212.20	0.00	27,212.20
Ppto. Devengado	0.00	24,367.62	0.00	24,367.62
Estimado a fin de año	* 0.00	27,212.20	0.00	27,212.20
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	89.55 %	0.00 %	89.55 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

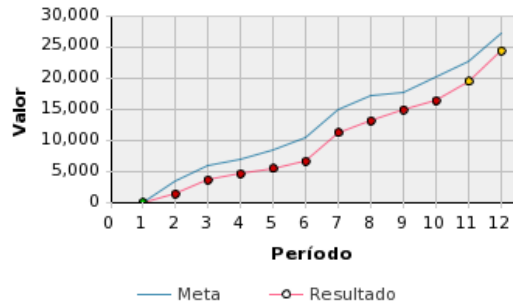

Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	3,490.36	1,306.52	3,490.36	1,306.52	37.43 %	●	4.80 %
Mar	2,500.00	2,210.79	5,990.36	3,517.31	58.72 %	●	12.93 %
Abr	800.00	985.56	6,790.36	4,502.87	66.31 %	●	16.55 %
May	1,620.24	910.58	8,410.60	5,413.45	64.36 %	●	19.89 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	1,991.60	1,131.24	10,402.20	6,544.69	62.92 %		24.05 %
Jul	4,590.00	4,699.60	14,992.20	11,244.29	75.00 %		41.32 %
Ago	2,120.00	1,778.82	17,112.20	13,023.11	76.10 %		47.86 %
Sep	600.00	1,851.62	17,712.20	14,874.73	83.98 %		54.66 %
Oct	2,350.00	1,379.35	20,062.20	16,254.08	81.02 %		59.73 %
Nov	2,650.00	3,162.23	22,712.20	19,416.31	85.49 %		71.35 %
Dic	4,500.00	4,951.31	27,212.20	24,367.62	89.55 %		89.55 %
Total	27,212.20	24,367.62					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar el conocimiento de los DDHH y de la Naturaleza de los diferentes actores de la Sociedad Civil y el Estado MEDIANTE la ejecución de talleres y eventos de capacitación.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Coordinación interinstitucional. Dx de las Provincias. Mayo 2013.pdf	Hito 16	05/06/2013
2	Coordinación con dirección tutelar.octubre 2013.pdf	Hito 47 Octubre 2013	12/11/2013
3	Taller Upse 17-05-13.pdf	Hito 15	05/06/2013
4	Encuentro Zonal CR2 18-11-13.pdf	Hito 52. Nov 2013	02/12/2013
5	Reunión de Coordinación DC y Alumnos convenio UPSE-DPE 11- 13.pdf	Hito 50. Nov 2013	18/12/2013
6	Coordinación con dirección nacional y gestión de procesos tutelares.pdf	Hito 14 y 17	05/06/2013
7	Visitas Monitoreo Delegaciones Nov 13 .pdf	Hito 53. Nov 2013	02/12/2013
8	Consolidado regional informes lotaip 28-03-13.pdf	Hito 10	04/04/2013
9	Talleres de capacitación funcionarios públicos (policías y maestros) Septiembre 13.pdf	Hito 44. Sept 2013	04/10/2013
10	Taller maestros. discriminación 29-11-13.pdf	Hito 54. Nov 2013	02/12/2013
11	Informes lotaip trimestre abril, mayo y junio 13.pdf	Indicador 7.2 Junio 13	05/07/2013
12	Informe final convenio UPSE-DPE 12-13.pdf	Hito 55 y 57 Dic 2013	03/01/2014
13	foda regional junio 13.pdf	Hito 23, junio 13	05/07/2013
14	Coordinación en temas tutelares con Dirección de Protección. julio 2013	Hito 27 y 30. Julio 2013	05/08/2013
15	Tiempo de Derechos CR2 dic 13.pdf	hito 58. Dic 2013	03/01/2014
16	Tiempo de derechos CR2 dic 13 (2).pdf	Hito 58 (2) Dic 2013	03/01/2014
17	Reporte reunión Diagnóstico social Los Rios 27-03-13.pdf	Hito 7	04/04/2013
18	taller grupos atención prioritaria LGBTI 28-03-13 .pdf	Hito 9	04/04/2013
19	visitas de monitoreo delegaciones Mayo 2013.pdf	Hito 18	05/06/2013
20	taller Adultos Mayores 28-05-13.pdf	Hito 19	05/06/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
21	informe remitidos a dirección de protección mes mayo 2013.pdf	Indicador 9.1/Mayo 2013	05/06/2013
22	visitas de monitoreo delegaciones Mayo 2013.pdf	Indicador 9.2/Mayo 2013	05/06/2013
23	Ejecución Proyecto UPSE-DPE.pdf	Hito 46. Oct 13	14/11/2013
24	Coordinación con Instituciones Publicas Mayo 2013.pdf	Indicador 2.6 /Mayo 2013	05/06/2013
25	Reuniones de coordinacion con ONGS Sociedad civil.pdf	Indicador 2.8/ Mayo 2013	05/06/2013
26	Coordinación de criterios de Tutela con Delegaciones provinciales. Dic 2013 pdf	Hito 56. Dic 2013	03/01/2014
27	Agendas y asistencias Talleres LOTAIP 03-13.pdf	Indicador 7.3	05/04/2013
28	Consolidado talleres Lotaip 03-13.pdf	Indicador 7.3 y 7.4	05/04/2013
29	Visitas de monitoreo.agosto 2013.pdf	Hito 36. Agosto 2013	05/09/2013
30	Modulo Presentación y revisión de proyectos convenio UPSE-DPE agosto 2013.pdf	Hito 35. Agosto 2013	05/09/2013
31	Reporte de reunión visitas a GAD agosto 13.hito 34.pdf	Hito 34.Agosto 2013	05/09/2013
32	visitas de monitoreo a delegaciones. sep 2013.pdf	Hito 41. Sep 2013	04/10/2013
33	Encuentro regional Machala 14 y 15-02-13.pdf	Hito 3 febrero	06/03/2013
34	Talleres de capacitación funcionarios públicos (policías y maestros) Septiembre 13.pdf	Hito 42. Sept 2013	04/10/2013
35	consulta sobre procedimiento y criterios de tutela.pdf	Hito 2 febrero	06/03/2013
36	Ejecución Modulo UPSE 28-09-13.pdf	Hito 38. septiembre 2013	04/10/2013
37	Capacitación a grupos de atención prioritaria. agosto 2013.pdf	Hito 37. Agosto 2013	05/09/2013
38	Coordinación criterios de tutela con direx de protección. sep 2013.pdf	Hito 40. Sep 2013	04/10/2013
39	Ejecución modulo UPSE-DPE.pdf	Hito 21, 06-13	05/07/2013
40	Coordinación con area Tutelar nacional 06-13.pdf	Hito 20 junio 13	05/07/2013
41	Visitas Monitoreo Sta Elena, Machala, Los Rios y Guayas (cantón Duran).pdf	Indicador 9.2.Abril 13	29/04/2013
42	informes Lotaip abril 13.pdf	Indicador 7.2. Abril 13	29/04/2013
43	Monitoreo delegaciones y coordinación con Dirección de protección 03-13.pdf	Indicador 9.1 y 9.2	05/04/2013
44	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 10-13.pdf	Hito 45. Oct 13	01/11/2013
45	Hito 5. talleres Lotaip febrero 13.pdf	Indicador 7.3 y 7.4	05/03/2013
46	Monitoreo delegaciones y coordinación con Dirección de protección 03-13.pdf	Hito 6 y 8	05/04/2013
47	Taller maestros. discriminación 29-11-13.pdf	Hito 54. Nov 2013	12/12/2013
48	Taller con AM. Mayo 2013.pdf	Indicador 1.5 Mayo 2013	05/06/2013
49	Coordinación con dirección tutelar.nov 13.pdf	Hito 51 nov 2013	12/12/2013
50	Taller con AM. Mayo 2013.pdf	Indicador 1.6 Mayo 2013	05/06/2013
51	monitoreo delegación provincial febrero 13.pdf	Indicador 9.1 y 9.2 febrero	05/03/2013
52	Instituciones capacitadas en LOTAIP febrero 13.pdf	Indicador 7.4	05/03/2013
53	Ejecución Proyecto UPSE-DPE.pdf	Hito 46. Oct 13	14/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
54	Acuerdos y compromisos incidencia con sociedad civil.pdf	Indicador 2.8, junio 13	05/07/2013
55	Acuerdos y compromisos incidencia instituciones públicas.pdf	Indicador 2.6, junio 13	05/07/2013
56	monitoreo delegación provincial febrero 13.pdf	Hito 4. Febrero	05/03/2013
57	poa 1-02-13.xlsx	Hito 1	14/02/2013
58	Vigilia Maritima Santa Elena 28-06-13.pdf	Hito 25, Indicador 1,4 junio 13	05/07/2013
59	Hito 5. talleres Lotaip febrero 13.pdf	Hito 5 febrero	05/03/2013
60	coordinación criterios de tutela-direx de promoción- agosto 2013.pdf	Hito 39. Sept 2013	07/10/2013
61	encuentro CR2 18 y 19 -07-13.pdf	Hito 31 Julio 2013	05/08/2013
62	Modulo UPSE-DPE Julio 2013.pdf	Hito 28. julio 2013	05/08/2013
63	Procesos zonales de capacitación con GAP sept 2013.pdf	Hito 43. Sep 2013	07/10/2013
64	Visitas de acompañamiento (elaboración Foda) julio 13.pdf	Hito 32. julio 2013	05/08/2013
65	Taller con Adultos Mayores 31-07-13.pdf	Hito 33. julio 2013	05/08/2013
66	Informes visitas de monitoreo y otros dirigidos a protección y promoción.pdf	Hito 24, Indicador 9.1 y 9.2, junio 13	05/07/2013
67	Informes remitidos a dirección de protección.pdf	Indicador 9.1.Abril 13	29/04/2013
68	Incidencia con ong soc civil. LGBTI, Adultos Mayores, Plan Internacional, Defensorias.pdf	Indicador 2.8.Abril 13	29/04/2013
69	Acuerdos Incidencia politica publica con Instituciones públicas.iess y upse.pdf	Indicador 2.6.Abril 13	29/04/2013
70	Visitas Monitoreo Sta Elena, Machala, Los Rios y Guayas (cantón Duran).pdf	Hito 13.abril 13	29/04/2013
71	Diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional. Reunión less Machala abril 13.pdf	Hito 12.Abril 13	29/04/2013
72	Acciones de coordinación con la dirección Nacional Tutelar.taller matriz mensual de casos y monitoreo cr2.pdf	Hito 11. abril 13	29/04/2013
73	Acuerdos con Inst Publicas para la incidencia 03-13.pdf	Indicador 2.6	04/04/2013
74	taller grupos atención prioritaria LGBTI 28-03-13 .pdf	Indicador 1.4 y 1.6	04/04/2013
75	Consolidado regional informes lotaip 28-03-13.pdf	Indicador 7.2	05/04/2013
76	acuerdos con inst sociedad civil para la incidencia 03-13.pdf	Indicador 2.8	04/04/2013
77	taller grupos atención prioritaria LGBTI 28-03-13 .pdf	Indicador 1.5	05/04/2013
78	Talleres DDHH a grupos de atención prioritaria 03-13.pdf	Indicador 1.4 y 1.6	04/04/2013
79	informe de monitoreo octubre 2013.pdf	Hito 49 Oct 2013	04/11/2013
80	Talleres DDHH a grupos de atención prioritaria 03-13.pdf	Indicador 1.4 y 1.6	05/04/2013
